

0273

V17

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO C.V.C. - C.E.E.

INFORME TRIMESTRAL

Julio - Octubre de 1991

TABLA DE CONTENIDO

- 1- Datos Generales y descripción general
- 2- Resumen del Trimestre
- 3- Actividades por rño
- 4- Informe del Fondo de Crédito
- 5- Informe Financiero
- 6- Listado de Personal

Cali, Enero de 1992.

CAJAS 81-3A.1. DESCRIPCION Y DATOS GENERALES

1 - DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto : Pequeños Proyectos Productivos en la Costa Pacífica.

Código del Proyecto : N° ALA 90/20

Localización : Departamento del Cauca y Valle del Cauca - Colombia.
Centro del Proyecto: Puerto Merizalde.
Subcentros: San Isidro, El Carmen, Noanamito, Puerto Saija.

Duración : 5 años (julio de 1.991 a junio de 1.996).

Autoridades Competentes : Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comunidad Económica Europea -CEE.

Entidad Coordinadora : Departamento Nacional de Planeación.

Entidad Ejecutora : Corporación Autónoma Regional del Cauca - CVC.

Contribución CEE : 11,2 Millones de ECU.

Contribución Gobierno : 2,8 Millones de ECU.

Contribución Beneficiarios : 1,1 Millones de ECU
15,1

2 . RESUMEN DEL PROYECTO

Este programa constituye la segunda fase de intervención en esta zona de la costa pacífica, del Convenio NA 85/16.

El proyecto se llevará a cabo en 18 zonas que comprenden los ríos Saija (4 zonas), Micay (3 zonas), Naya (3 zonas), Yurumanguí (3 zonas) y Cajambre (3 zonas) y las bocanas de los ríos Bubuey (1 zona) y Timbiquí (1 zona).

El Proyecto se materializa en la conformación de una serie de Pequeños Proyectos Productivos de las comunidades rurales con nivel de vida de casi subsistencia, en los campos de la agricultura, de la pesca, de la minería y de la artesanía en los Departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

El objetivo primordial del Proyecto es generar un proceso de autodesarrollo de estas comunidades, basándose en la organización comunitaria, el asociativismo y la comercialización de doble vía.

Los instrumentos que el Proyecto pone a disposición de los beneficiarios son la Asistencia Técnica, un Fondo Rotatorio de Crédito, el apoyo al asociativismo y a la comercialización. Además colaborará en la construcción de infraestructura social y productiva y con el fomento de Pequeñas Plantas de Procesamiento.

Como la participación activa de la población es fundamental, las acciones del Proyecto estaría orientadas a la organización de las comunidades en asociaciones de productores y en una organización central apta para manejar el conjunto de las acciones iniciadas.

3 . OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 El objetivo general es promover un proceso de desarrollo autónomo y sostenible, que permita mejorar las condiciones económicas y sociales de las poblaciones de la región, fortaleciendo los sistemas de participación activa de los beneficiarios.

Los objetivos propuestos son:

- Consolidar las acciones llevadas a cabo durante la primera fase, sobre todo en materia de créditos y de asistencia técnica.
- Dar continuidad a los objetivos y métodos de trabajo probados en la primera fase, utilizando al máximo el mecanismo central ya establecido.
- Actuar de manera selectiva para mejorar las técnicas de producción, (agrícola, pesca, minería, artesanía), de procesamiento y de almacenaje - comercialización.

3.2. Objetivos Específicos

- Económicos: Mejoramiento del ingreso individual; creación y estabilización del empleo y utilización de los recursos provenientes de los excedentes comercializables y del aumento de la producción agraria, artesanal, de la pesca y de la explotación minera de la zona del programa.
- Sociales: Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades (salud, alimentación, educación), a su promoción comunitaria, capacitación tecnológica y de gestión y a la disminución de la tendencia actual a la emigración.

- Fomentar el asociativismo -cooperativismo como estrategia para la autogestión y para asegurar la comercialización de doble vía.
- Lograr la participación en el programa de alrededor de 2.600 familias del sector agrario; 1.900 familias del sector minero; 600 familias del sector pesquero y 300 familias del sector artesanal e indígena.
- Beneficiar a 5.400 familias en total; estas recibirán al menos un crédito que les permita emprender o mejorar una actividad productiva.
- Se pretende obtener como mínimo doblar la renta familiar que actualmente se estima en 0,7 del salario mínimo nacional.
- Ejecutar alrededor de 300 pequeñas obras de infraestructura de interés público local (muelles, embarcaderos, gradas de acceso, muros gavionados, puentes peatonales, vías peatonales); de marcado interés social (escuelas, hogares infantiles, electricidad) o de interés económico (Tiendas Comunitarias, Tiendas Líderes, Centros de Acopio, Cavas Comunitarias).
- Capacitar a 160 Promotores Veredales para dar continuidad a la promoción de las innovaciones propuestas por el programa y de prestar asistencia técnica a las familias.
- Aumentar la producción agraria, pesquera y minera de la zona del programa.

2. RESUMEN DEL TRIMESTRE

RESUMEN DEL TRIMESTRE

Este tercer trimestre es el inicio de la segunda etapa del Convenio; es un trimestre en el que se prepara lo relacionado con el diagnóstico de las nuevas zonas.

En las zonas donde ya se venía trabajando, se continúa con el seguimiento y Asistencia Técnica a los grupos de beneficiarios de crédito. De igual forma se continúa con la promoción del Proyecto y la amplificación de su cobertura en los viejos ríos, mediante el otorgamiento de nuevos créditos y el mayor alcance poblacional con la Asistencia Técnica, mediante la labor de los Promotores Veredales.

Otro elemento importante fué la realización de talleres de Planeación de Proyectos Orientadas a Objetivos, realizados con beneficiarios, en los cuales mediante una metodología adaptada de estos P.P.O, se identificaron diversos problemas en cada área productiva y se propusieron varias alternativas de solución a los mismos.

Se constituyó la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Pacífico - CREDIPACIFICO, conformada para que en un futuro reciba y maneje el Fondo Rotatorio de Crédito; en ella tienen ahora representación Representantes Veredales de los ríos.

Se hace ajuste a la estrategia de los Centros de Acopio de Pesca, tomando el Proyecto en sus manos el montaje y administración a todo costo de un Centro Piloto de Acopio Pesquero, previa autorización de la correspondiente Asociación.

Se hacen los seguimientos recomendados por el técnico a los ensayos de control fitosanitario en las palmas de coco y chontaduro.

Dentro de la estrategia de promoción de la propuesta agroforestal,

AGRICULTURA



1



2



3

Charlas para el personal técnico del Proyecto foto 1 -, charlas para los Promotores Veredales foto 2 - y días de campo para agricultores con el apoyo de los Promotores Veredales, son actividades que forman parte del gran objetivo de controlar la gualpa , vector causante del Anillo Rojo.

Se ha dado especial impulso a la constitución de viveros de borajó y leguminosas.

En el sector pesquero se consideraron propuestas de ensayos para el mejoramiento de técnicas de navegación, para abaratar los costos de la faena de captura.

En algunos lugares se opta por la conformación de Comités de apoyo a las microrealizaciones como estrategia complementaria para la participación de la comunidad en las obras.

Debido a la priorización en la terminación de algunas obras de importancia construidas a todo costo (sin la participación de la comunidad) y a dificultades para el transporte de materiales, algunas microrealizaciones han tenido demoras para su terminación.

AGRICULTURA

. Con el apoyo de los Promotores Veredales, se continúa con el seguimiento y control a los créditos otorgados y con el ofrecimiento de Asistencia Técnica y seguimiento a las labores de mantenimiento de los cultivos.

En Asistencia Técnica se dá especial énfasis a lo relacionado con la construcción y manejo de viveros de leguminosas y borajó, a las labores culturales propias de este cultivo y al control de plagas y enfermedades.

Producto del trabajo de los extensionistas y de los asesores socio-empresariales, se ha presentado el plan de refinanciación y el de financiación del cultivos con el nuevo modelo agroforestal.

Con los equipos técnicos (extensionistas) de los tres ríos, se

AGRICULTURA



Para el control del vector que afecta al chontaduro causando el prematuro desprendimiento de sus frutos, se está ensayando el embolsamiento de su inflorescencia, acudiendo para ello a la creación y construcción de un instrumento artesanal que facilita la colocación de la bolsa. Esta práctica se ensaya con otras para evitar el ataque del cucarrón que causa el desgrane.

realizó la unificación de criterios técnico-económicos de la propuesta agroforestal. La anterior propuesta tuvo dificultades para la comercialización de productos anuales y bianuales, las cuales se esperan superar en la actual propuesta.

- . Se realizan actividades de capacitación dirigida a Promotores Veredales, sobre la nueva propuesta agroforestal.
- . Con los grupos de beneficiarios cuyas solicitudes han sido aprobadas, se realizan charlas explicativas sobre los compromisos que se adquirirán al aceptar recibir el crédito otorgado, recalcando lo relacionado con la responsabilidad mancomunada.

PESCA

- . La estrategia de organizar un Centro de Acopio pesquero en cada bocana, es ajustada, orientándose ahora hacia la construcción de un Centro Piloto de Acopio Pesquero en la vereda de Concherito (río Naya), y el montaje de grandes cavas en las bocanas de los restantes ríos y la puesta en funcionamiento de una embarcación que transporte lo acopiado por las cavas hasta el Centro Piloto de Acopio y de allí hasta Buenaventura.
- . Se estudian varias propuestas para el mejoramiento del sistema de transporte para la captura, buscando abaratar este ítem de la producción; se consideran principalmente dos propuestas, acogiendo una de ellas, la que será llevada a cabo a manera de ensayo piloto.
- . La Asistencia Técnica se orienta al montaje y manejo de cavas, mantenimiento de motores fuera de borda y conservación y enhielado de pescado principalmente.
- . Con la participación de los Promotores Veredales, se brinda apoyo a



En la foto superior el Centro Piloto de Acopio, en Concherito, río Naya. Este será el eje del ensayo de acopio y comercialización de pescado y mariscos; está dotado de cuarto frío y almacenamiento de hielo para las cavas de las otras bocanas y para los mismos pescadores.


En la foto inferior un grupo de pescadores revisan el borrador de varias cartillas, que una vez ajustadas con base en las observaciones de ellos, se reproducirán y serán material didáctico para temas como enhielado de pescado cuidados al producto y cuidado a los equipos de pesca.

la organización de las Asociaciones de Pescadores, principalmente en el río Saija en donde por conflictos internos de la comunidad, se tienen problemas organizativos.

- . Se realizan talleres de capacitación dirigidos a Promotores Veredales y pescadores, sobre el manejo de la "Ficha Operativa diaria de pesca"; con la colaboración de los primeros la ficha se ha venido llevando y con ello se está acopiando información sobre volúmenes y tipos de pesca, la que será de utilidad para la comercialización futura.

MINERIA

- . Con el apoyo de los Promotores Veredales se realiza el seguimiento y control a los créditos otorgados, así como las labores de Asistencia Técnica.
- . La Asistencia Técnica se ofrece orientada a la utilización del canalón, el mantenimiento de motores estacionarios, técnicas de cateo, seguridad minera, manejo de equipos y buceo en el dragado del oro.
- . Se promueve el mejoramiento de técnicas extractivas y de transporte de material para su lavado, mediante la utilización de poleas y baldes que se deslizan por alambres colocados en desnivel. Con estas mejoras se minimiza el esfuerzo humano y se agiliza la labor de transporte de material.
- . Se elaboró en cada río un plan para recuperación de suelos explotados en minería con el propósito de lograr su reforestación; estos planes son llevados a cabo con el apoyo del Promotor Veredal.
- . Se promueve la conformación de las asociaciones de mineros en cada río.

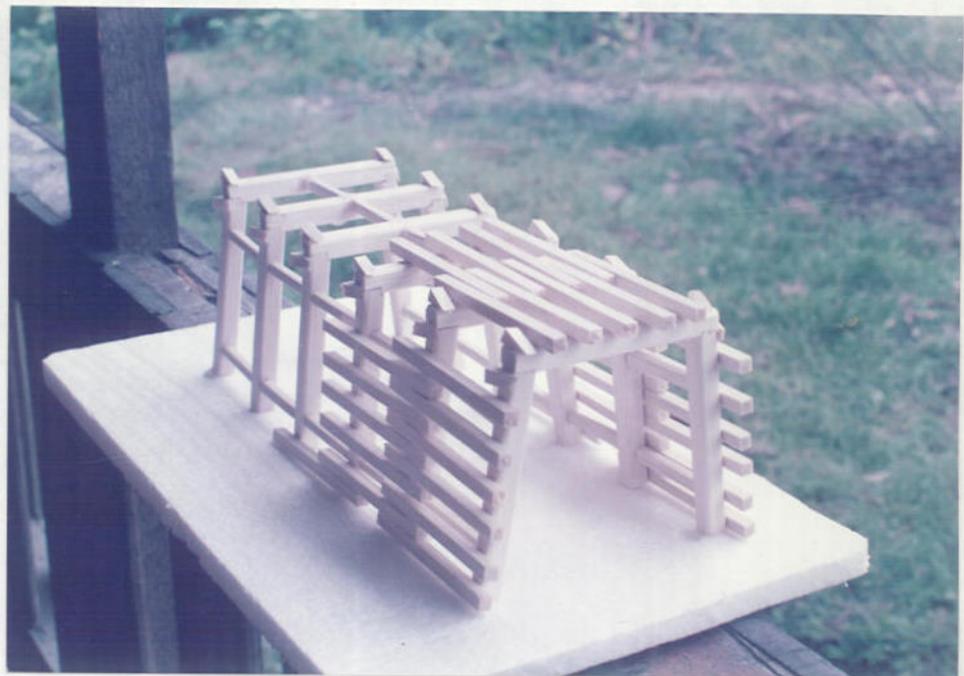

En algunos lugares del río Saija, se están construyendo socabones por iniciativa de los mineros; el equipo técnico del Proyecto ha elaborado una maqueta educativa para orientarles y corregir errores que puedan estar cometiendo en la construcción.

El transporte de material en baldes a través de alambres tendidos en desnivel, facilita y agiliza esta labor en el frente minero (Foto de la izquierda).

- . Se realizan reuniones con grupos de mineros beneficiarios de crédito, para evaluar la situación de los créditos.

COMPONENTE SOCIO-EMPRESARIAL

- Elaboración de los análisis de rentabilidad de las solicitudes de crédito presentadas por la comunidad.
- En conjunto con los criterios de los técnicos correspondientes, se realizan los cálculos económicos para las solicitudes y propuestas de refinanciación, condonación y nuevas propuestas de crédito.
- Conjuntamente con los extensionistas, se realizan charlas dirigidas a los beneficiarios que hayan sido favorecidos con crédito, para explicarles el alcance del compromiso que adquirirán si aceptan el préstamo y lo que significa la responsabilidad mancomunada.
- Se realizan talleres sobre contabilidad básica dirigidos a las juntas Directivas de las Tiendas Comunitarias y a los respectivos tenderos o administradores de las mismas.

PROMOCION COMUNITARIA

- . Se brinda apoyo a la gestión de las Tiendas Comunitarias y las Tiendas Líderes, en lo relacionado con funciones de la directiva y promoción los servicios de la Tienda en la comunidad.
- . Se brinda apoyo a la promoción y constitución de Asociaciones y Cooperativas de productores.



1



3



2

La Asociación de las tiendas Comunitarias en cada río ha facilitado la orientación de políticas de mercadeo y precios para sus asociados. En la foto 1 una reunión de Asociación de Tiendas. En la foto 2 se ve claramente el resultado de una iniciativa del organismo y en la foto 3 se aprecia el interior de una Tienda.

- . Se orienta a las comunidades para la identificación de las microrealizaciones prioritarias y se les estimula para su participación en las obras correspondientes, creándose en algunos casos Comités de Apoyo a las microrealizaciones.
- . Se apoya la gestión de los Representantes Veredales, colaborándoles para la promoción, preparación y realización de sus reuniones veredales, zonales, de río e inter-ríos.
- . Recogiendo la iniciativa de los mismos Representantes Veredales, se modifica la manera de realizar las reuniones inter-ríos; ahora los Representantes se reúnen por separado de los funcionarios durante la primera parte del evento; en la segunda parte se hace la reunión conjunta y los Representantes exponen los problemas que han identificado en el trimestre y las alternativas de solución a cada caso.

ASOCIATIVISMO

Se intensifica la capacitación cooperativa en el mes de julio en el río Naya y se organiza el Seminario Cooperativo para Funcionarios en Cali.

Se concluye la capacitación cooperativa para Representantes Veredales y Representantes de las Asociaciones con la fundación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Pacífico - CREDIPACIFICO.

PESCA

Se asesora a la parte social de los tres ríos, entregando proyectos



Antecedido de varias jornadas de capacitación en cada río y de un encuentro Cooperativo en el cual se pudo apreciar y evaluar favorablemente el nivel de apropiación que los Representantes Veredales lograron de los conceptos básicos cooperativos (expresados con creatividad, como se ve en las fotos superiores), se constituyó CREDIPACIFICO luego de una última jornada de 3 días en los cuales se discutieron los estatutos y se definió su nombre (foto de la izquierda).

de estatutos, para cada una de las asociaciones de pesca, con el fin de que se hagan conocer.

. ASOCIACION DE TIENDAS

Se tienen elaborados los estatutos para las asociaciones de los ríos Naya y Saija; el río Saija preparó la Asamblea de constitución, pero no se ha cristalizado por problemas internos en la documentación. La Asociación de Tiendas del río Micay viene trabajando con la Personería Jurídica de "ASOPOMY"; los asociados no han definido si crean otra organización o reforman los estatutos de "ASOPOMY", para acondicionarlos a los objetivos de la Asociación de Tiendas.

. MINERIA

Se elaboró estatutos y documentación para la Asociación de Mineros del río Micay, con sede en San Antonio de Chuare. El grupo se encuentra bien constituido y sólido. En Boca de Patia (río Saija), se encuentra un grupo de mineros de este río; lleva varios años organizado y funcionando y está recibiendo la asesoría de los funcionarios que laboran en el río Saija. Falta definir qué clase de organización se funda.

En cuanto los mineros del río Naya, es un grupo más difícil de organizar pues demuestra más individualismo, situación por la cual la parte social de la zona 03 y la técnica minera quieren dar un plazo prudencial para buscar la consolidación del grupo.

COMERCIALIZACION

Se desarrollaron acciones en:

a. Levantamiento de Estadísticas

Con el apoyo de los técnicos y los asesores socio-empresariales, se levantaron datos estadísticos básicos sobre producción agrícola, pesquera, minera, forestal y artesanal.

Esta información arroja datos sobre volúmenes, estados de producción, formas de acopio, comercialización (volúmenes y canales) y precios. También entrega registros sobre el estado organizativo de los productores.

b. Pequeñas Plantas Procesadoras

Se ha trabajado en la identificación de algunas alternativas de transformación de productos; también en el diseño, construcción y dotación de un laboratorio de muestras de procesamiento.

Se ha dedicado también un espacio a la vinculación con la comunidad en procura de estimular confianza y circulación de información en doble vía, sobre aspectos tanto de procesamiento como de comercialización.

c. Comercialización.

En este punto se ha trabajado en dos frentes:

1. La comercialización de los bienes básicos hacia las Tiendas Líderes; se han logrado buenos descuentos en los costos de los productos, favoreciendo el objetivo final del programa.

Los tres ríos están ya unificando sus fechas de compra de la remesa, lo que abarata costos.

2. La comercialización de productos de la zona (agrícolas y pescado). Es necesario mejorar el aspecto de mercadeo principalmente en los productores para luego encarar en mejores condiciones la comercialización de los productos.

d. **Mercadeo**

Se han realizado diferentes visitas, intercambios y correspondencia con empresas especializadas nacionales e internacionales.

Se observa en los productores el deseo de entrar en la competencia de oferta del producto, pero este aún no tiene definidas en forma clara ni para el productor ni para el comprador el atributo, el posicionamiento y el concepto del producto.

De igual manera se está trabajando en la línea, combinación, amplitud y consistencia del mismo.

Se puede afirmar que con el productor se está trabajando en la sensibilización y formulación del concepto de mercadeo y con el comprador en lo relacionado con el posicionamiento del producto.

También se ha incursionado en los canales de distribución, buscando alcanzar aquellas que faciliten una buena posición competitiva

de los productos, evadiendo el eslabón intermediario para dejar esta ganancia agregada en manos del productor.

Alternativamente se ha trabajado en la investigación de mercadeo con:

- . Estudios explorativos
- . Muestras y experiencias mancomunadas
- . entrevistas con personas especializadas
- . Fuentes secundarias
- . Experimentos controlados
- . Simulaciones
- . Encuestas.

Específicamente frente a cada producto, los desarrollos son los siguientes:

Coco: - Se ha facilitado información sobre mercado de coco a la Asociación del Micay.

- Se ha traído un comprador potencial, el cual ya ha comenzado a tener la práctica en el Saija y en el futuro con el Micay.

Pesca: - Se tiene todo un proyecto de comercialización con la compra de todo el producto pesquero de la zona (fresco, enhielado y congelado entero, tronco y filete).

MICROREALIZACIONES

Dos elementos se destacan en el trimestre: uno lo es la constitución de Comités de apoyo a las microrealizaciones en algunos lugares, los cuales evalúan la gestión del Proyecto en este aspecto y también

evalúan la participación de la comunidad en las mismas, presentando propuestas de correctivas a estos aspectos.

El otro elemento es la prioridad que se le ha dado a la ejecución de algunas obras de apoyo a la infraestructura del Proyecto (ampliaciones en el campamento y taller de Puerto Merizalde), lo que sumado a dificultades de transporte, han generado retraso en la terminación de algunas microrealizaciones.

3. ACTIVIDADES POR RIO

- _ Río Naya
- Río Micay
- Río Saija

3. **ACTIVIDADES POR RIO**

RIO MAYA

RESUMEN DEL TRIMESTRE

En el tercer trimestre (julio 1 a septiembre 30/91), el equipo de trabajo del río Naya desarrolló las siguientes actividades trazadas por la Codirección y Grupo Orientador.

ASISTENCIA TECNICA

- Para agroforestación se ha dado continuidad a través de Técnicos y Promotores a la revisión, seguimiento y control del crédito de los diferentes grupos de las 3 zonas del río, realizandose paralelamente la transferencia de tecnología con énfasis en la instalación de viveros, labores culturales del cultivo y control de plagas y enfermedades.

Se viene ejecutando el plan de mantenimiento de coco para la zona 01 donde 13 grupos conformados por 40 agricultores para 50 Ha ha recibido la capacitación necesaria para el manejo del crédito. Paralelamente se viene presentado en las 3 zonas el plan de refinanciación y financiación con el nuevo modelo agroforestal para los agricultores del río Naya.

- En pesca se viene trabajando con las unidades existentes en talleres sobre mantenimiento del motor fuera de borda, manipuleo, conservación y enhielado del pescado, supervisión continua del Centro de Acopio

el cual a través de la administración por parte del Proyecto y la Asociación de Pescadores Artesanales, dará respuesta a las inquietudes de la comunidad de pescadores los cuales podrán contar con un sitio para acopiar, enhielar, congelar y comercializar el producto.

- . En minería la asistencia va dirigida principalmente a la utilización del canalón y operación y mantenimiento de los motores estacionarios.

Asistencia crediticia

. ZONA 01 - Créditos colocados

Plan de mantenimiento en coco - 13 grupos - 40 beneficiarios para un total aprobado de \$11'709.996.00.

. ZONA 03 - Créditos otorgados

6 grupos - 19 beneficiarios para un desembolso de \$8'850.380.00.

El grupo de trabajo está promocionando las refinanciaciones para los créditos en agroforestería y se financiarán nuevos créditos con la nueva propuesta agroforestal.

. Promoción Comunitaria

Se viene apoyando el trabajo con las Tiendas Comunitarias y la Tienda

Líder, las cuales han dado un avance en la administración contable. Al mismo tiempo se viene promocionando la conformación de la Asociación de Tiendas Comunitarias, apoyándose la elaboración de estatutos a los delegados de cada Tienda, quedando pendiente el análisis de los mismos a los socios de cada Tienda Comunitaria existente. Para la zona 01 se realizó la asamblea de constitución de la Asociación de Pescadores Artesanales del río Naya (ASOPARNA), quedando pendiente el otorgamiento de la personería jurídica en Bogotá.

También se está trabajando en la asesoría y capacitación a Promotores y Representantes Veredales con temas sobre participación comunitaria, cómo hacer reuniones y priorización de necesidades comunitarias.

Microrealizaciones

En este trimestre este programa ha tenido un retraso sobre todo para las zonas altas (02 y 03) del río; las razones expuestas se explican en el literal 3.4, a pesar de los inconvenientes presentados existen avances significativos en algunas obras como son el Centro de Acopio de Pesca, la Tienda Líder y la ampliación campamento de Puerto Merizalde.

Coordinación de Trabajos Interinstitucionales.

- . Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca: aporte de 2 técnicos ubicados en las zonas 01 y 03.
- . Instituto Colombiano Agropecuario (ICA); asesoría para el estudio del barrenador del chontaduro y otras plagas que se vienen presentando.

- . Eduardoño (Eduardo Londoño - empresario particular); apoyo con experto pesquero y técnicos de motores fuera de borda.

Capacitación Funcionarios

- . Seminario sobre cooperativismo para líderes.
- . Capacitación y gira en Agroforestería: Bajo San Juan - Calima - Conif y Universidad del Tolima.

Otros Trabajos

- . Plan Operativo año 1.992.
- . Manual de funciones del personal del río.
- . Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos (P.P.O) en: minería, agroforestería, pesca y funcionarios.

3.1. ASISTENCIA TECNICA


3.1.1. ASISTENCIA TECNICA EN AGRICULTURA

3.1.1.1. ZONA 01 - PUERTO MERIZALDE

- . La Asistencia Técnica se dirigió principalmente a la colocación de crédito para el mantenimiento del cultivo de coco y capacitaciones puntuales a los Promotores Veredales de la zona. A continuación se presenta (figura No 1) un histograma de participación versus métodos de extensión utilizados para la transferencia de tecnología.
- . Se realizaron 2 días de campo, el primero en la vereda de Santa Cruz, con la participación de 8 agricultores para realizar el ensayo de fertilización en cultivo establecido de coco, utilizando el diseño de bloques al azar, con 6 tratamientos y 6 replicaciones. Los resultados se presentarán en el transcurso de los próximos periodos. El segundo día de campo fué en la vereda de San Miguel, con la participación de 12 Promotores Veredales, para realizar el seguimiento "Toma de datos de inflorescencia en chontaduro".
- . Se realizó 1 taller en la vereda de San Miguel, con la participación de 6 Promotores Veredales y 8 cultivadores de coco sobre "Costos de producción para la siembra de 1 Ha de coco".
- . Se efectuaron 2 capacitaciones en Puerto Merizalde con la participación de 12 Promotores Veredales sobre "Consideraciones generales para el trabajo agrícola en la zona", entregándose la guía técnica y evaluación de la misma.

La segunda capacitación se realizó en la vereda de Puerto Valencia

FIGURA No. 1

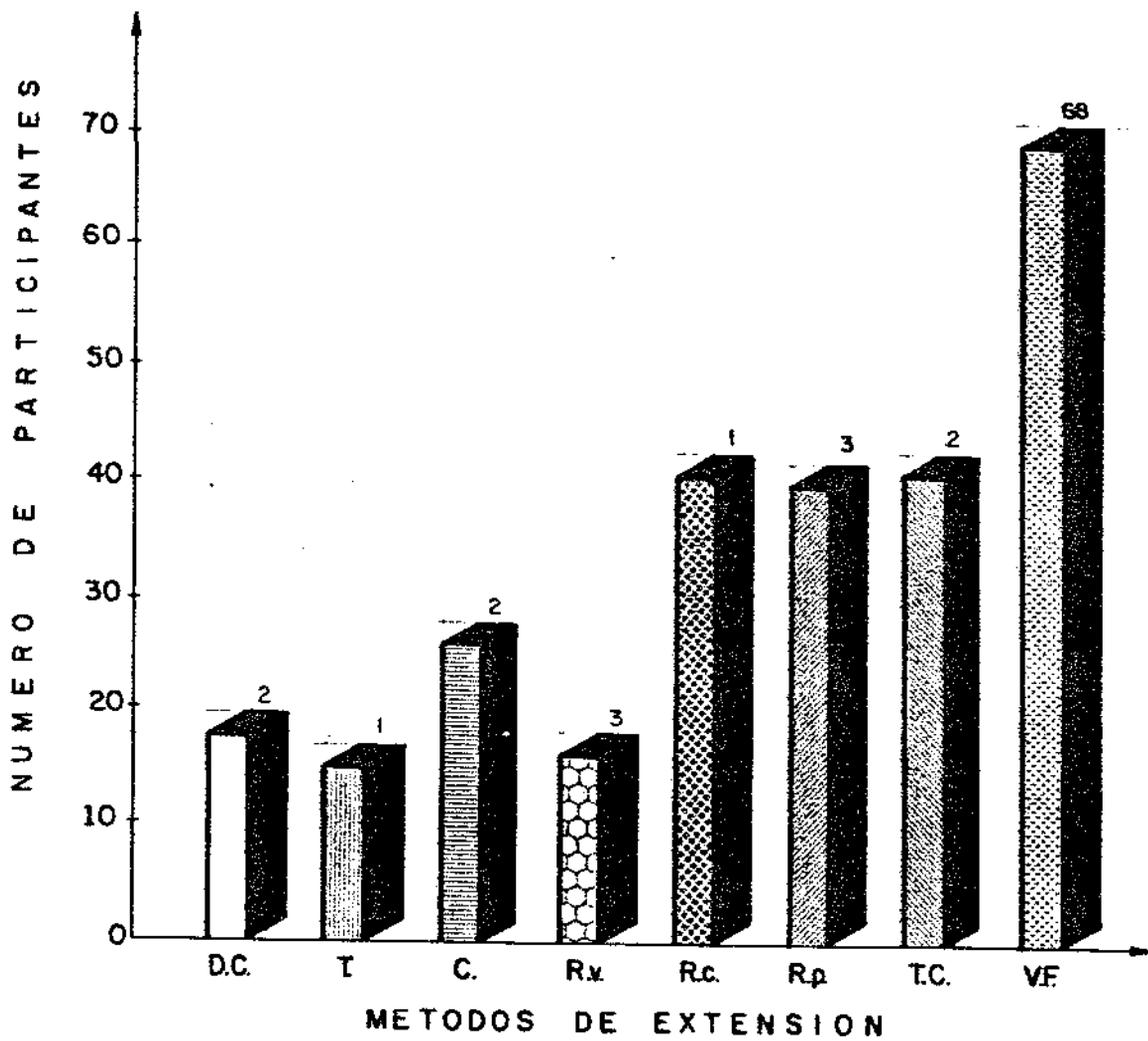

-  D.C.- DIA DE CAMPO
Con participación de P.V., agricultores y beneficiarios de crédito.
-  T - TALLER.
Dirigido a P.V. y cultivadores de coco.
-  C. - CAPACITACIONES.
Dirigida a P.V. y un Técnico agrícola.
-  R.v. REUNIONES (veredales)
Dirigida a beneficiarios vivero comunitario
-  R.c. REUNIONES de crédito.
Dirigida a beneficiarios de crédito a refinanciar y P.V.
-  R.p. REUNIONES (de programación)
Dirigida a P.V y equipo Técnico de la Zma. D1
-  T.C.- TALLER - CAPACITACION
Dirigida a beneficiarios de mantenimiento en coco
-  V.F. VISITAS A FINCAS Y/O LOTES.

con la participación de 12 Promotores de la zona y el tema fue:
"Consideraciones para la construcción de un vivero comunitario".

- . Se hicieron 3 reuniones veredales para apoyar el trabajo del vivero comunitario, la primera se basó en la organización de grupos de trabajo, la segunda sobre consecución de materiales y trazado del lote y la tercera construcción del vivero.
- . Se hizo una reunión sobre refinanciación de créditos en Puerto Merizalde, dirigida a 14 grupos de créditos para un total de 35 beneficiarios y 5 Promotores Veredales.
- . Se realizaron 3 reuniones de programación con Promotores Veredales donde se evaluó el trabajo realizado y se programó el calendario de trabajo del período.
- . Se efectuaron 2 taller - capacitación dirigido a 40 Beneficiarios de Crédito de mantenimiento de coco, para explicar el manejo, uso del crédito, desembolsos, reembolsos y relación costo/beneficio.
- . Se efectuaron 68 visitas a fincas del grupo técnico en las cuales se realizó: Revisión y seguimiento del crédito agroforestal y mantenimiento de coco, transferencia de tecnología en viveros, drenajes, control de plagas y enfermedades y trabajo grupal en el lote.
- . Para el plan de mantenimiento de coco fueron aprobados 13 grupos de créditos que beneficiaran a 40 agricultores, cubriendo 50 Ha en las veredas de:
 - Resguardo Indígena: 2 grupos - 6.5 Has.
 - Santa Cruz : 2 grupos - 9.0 Has
 - El Cacao : 1 grupo - 3.5 Has
 - San Miguel-Ajicito: 1 grupo - 4.0 Has
 - San Pedro : 2 grupos - 6.0 Has

San Fernando : 2 grupos - 8.0 Has
Puerto Merizalde : 1 grupo - 6.0 Has
Puerto Valencia : 1 grupo - 3.0 Has
San José : 1 grupo - 4.0 Has

El valor total de los créditos fue \$11'709.996 entregándose hasta la presente el primer desembolso.

. Se elaboró la relación de los grupos (41 beneficiarios) a los cuales se les condonará la inversión hecha en plátano.

3.1.1.2. ZONA 02 - SAN FRANCISCO

- Se da continuidad a las visitas a los lotes de beneficiarios con el fin de realizar el control de inversión, observación y recomendación del estado fitosanitario de los cultivos. Las principales actividades de desarrollo son las siguientes:
- Visitas a lotes de beneficiarios: 71, que corresponde al 70% de beneficiarios de la zona 02.
- Visitas efectuadas para lotes de nuevos beneficiarios: 12 en las veredas: El Carmen, Juan Nuñez y San Antonio.
- En las visitas efectuadas a los beneficiarios las recomendaciones técnicas que se dan son:
 - . Control de hormiga arriera y defoliador del borojó con agroquímicos de contacto y sistémicos.
 - . Labores culturales: Desyerbas, plateos.
- Dentro de los grupos de beneficiarios el balance general técnico es aceptable, presentandose cierta dificultad en la siembra de los hijuelos de chontaduro, debido al problema fitosanitario del barrenador del chontaduro.
- Se elaboró la relación de los grupos a los cuales se les condonará la inversión hecha en plátano.

Capacitación.

- Taller sobre obtención de crédito, responsabilidad mancomunada para

15 posibles beneficiarios de crédito, de las veredas Juan Nuñez, San Antonio y El Carmen.

- Presentación de nueva propuesta agroforestal y refinanciación para Promotores Veredales.
- Gira demostrativa y demostración de método para establecimiento y mantenimiento de cultivos agroforestales en la vereda Santa María con la participación de 23 Promotores Veredales y beneficiarios de crédito.
- Demostración de método en especies menores, cuidados y manejo para estudiantes de post-primaria con la participación de 40 estudiantes.
- Se realizaron reuniones puntuales con Promotores y Representantes Veredales para programaciones de trabajo e informe de actividades.
- Se efectuaron 6 reuniones con beneficiarios de crédito de las veredas: Sagrada Familia, Prieto, San Francisco, El Pasto, Santa María y El Carmen para tratar temas relacionados de Asistencia Técnica y Responsabilidad Mancomunada.

Otras Actividades:

- . Seguimiento al ensayo de chontaduro: periodos de inflorescencia.
- . Siembra, evaluación y comportamiento de una variedad de maíz frente a la variedad regional "Chococito". Se pretende mejorar el sistema de siembra y observar el comportamiento de esta variedad en la región para mejorar la producción de esta labor que en la región del Naya es importante.

- . Fertilización en borojó con urea y triple 15; actualmente podemos manifestar que hay respuesta positiva de la planta.

3.1.1.3. ZONA 03 - LA CONCEPCION

- Se realizaron 25 visitas para 37 beneficiarios de crédito.
- Control de plagas en 12 lotes de agricultores.
- Fertilización en 6 lotes de agricultores para borojó y chontaduro.
- Entrega de material vegetativo de viveros comunitarios para 12 beneficiarios:
 - 1675 árboles de borojó
 - 375 palmas de chontaduro
 - 655 árboles de leguminosas.
- Construcción de nuevos amacigos y germinadores para beneficiarios.
- Elaboración de relación de grupos a los cuales se les condonará la inversión hecha en plátano.
- Capacitación a Promotores y Beneficiarios:
 - . 3 demostraciones de método sobre fertilización.
 - . 3 demostraciones de método sobre control de plagas y enfermedades.
 - . 2 demostraciones de método sobre manejo de insumos agrícolas.
 - . 1 demostración de método sobre manejo de equipos de fumigación.
- . Entrega de terceros y cuartos desembolsos a 4 grupos de beneficiarios.

- . Reuniones puntuales con Promotores y Representantes Veredales para programaciones.
- . Asistencia Técnica en especies menores.

3.1.2. ASISTENCIA TECNICA EN PESCA

3.1.2.1. ZONA 01 - PUERTO MERIZALDE

- Capacitación a 16 usuarios de crédito en manipuleo, conservación y enhielado de pescado en la vereda de Concherito.
- Capacitación a 18 beneficiarios de crédito (escaladoras y pescadores) sobre "Aprendamos a conocer los productos marinos" en la vereda de Concherito.
- Se realizaron 2 talleres en colaboración con Eduardoño sobre "Mantenimiento del motor fuera de borda" con la participación de 30 pescadores.
- Se efectuó 1 taller sobre "Primeros auxilios, mantenimiento del motor" en la vereda de Concherito con la participación de 12 pescadores.
- Se efectuó un taller con 22 pescadores en la vereda de Santa Cruz, para analizar la problemática de la pesca y buscar posibles soluciones.
- Se terminó la construcción de la cava aislada con balsa y revestida con aluminio en la vereda de Santa Cruz.
- Se efectuó un reconocimiento con un experto en pesca donde se propone ampliar los equipos, adecuar embarcaciones con motores de centro diesel y equipos de navegación que permitan ubicar los bancos de peces.

- Se colaboró y participó en la reuniones efectuadas con la Asociación de Pescadores Artesanales del río Naya (ASOPARNA) en la cual se estructuraron los estatutos y la Junta Directiva fijándose metas para la agilización de la Personería Jurídica, capacitación y manejo del Centro de Acopio.
- Supervisión continua en la construcción de Centro de Acopio de Pesca (aislamiento térmico) y seguimiento a la Planta de Hielo Matia Mulumba.
- Acompañamiento y evaluación del retiro de equipos por parte de Solidarios.
- Cotización de equipo de pesca y embarcaciones para propuesta de pesca de altura.
- Aplicación con 3 Promotores Veredales en el manejo de la ficha operativa de pesca y seguimiento continuo a las diferentes Unidades Económicas de Pesca de las veredas de Concherito, Santa Cruz, Chamuscado, La Vuelta, Puerto Merizalde y Ajicito.

3.1.3. ASISTENCIA TECNICA EN MINERIA

3.1.3.1. ZONAS: 02 y 03 - SAN FRANCISCO Y LA CONCEPCION

- Se realizaron 30 visitas de Asistencia Técnica a 13 grupos de minería para un número de 51 beneficiarios correspondientes a las veredas: La Concepción, San Antonio, Calle Larga, San Antonio y Guadualito. Los seguimientos a los beneficiarios también son llevados a cabo por Promotores Veredales, los cuales están cumpliendo con las recomendaciones técnicas dadas por la técnica.

- Dentro de las recomendaciones efectuadas en el formato de Asistencia Técnica, está el uso del Canalón y la colocación de la malla para la recuperación del metal.
- Se realizaron los acompañamientos para la compra de equipos de nuevos beneficiarios.

Capacitación.

- Se realizó una capacitación sobre "Uso y mantenimiento de equipos de minería" dirigida a Promotores y Beneficiarios a los cuales se les incluyó el manejo del crédito; asistieron 6 grupos beneficiarios y 5 Promotores Veredales, para un total de 32 personas.
- Se efectuó una segunda capacitación sobre "Conceptos básicos en minería" dirigido a 12 beneficiarios y 5 Promotores Veredales.
- Se hizo un taller sobre "Planificación de Proyectos dirigida a Objetivos" P.P.O., con la asistencia de 14 beneficiarios y Promotores Veredales donde se identifican, priorizan y se presentan alternativas de solución a los problemas que se presenten.
- Se realizaron reuniones puntuales con Promotores y Representantes Veredales, donde se programó y se evaluó el trabajo de la zona.

Crédito.

- Se presentaron y se aprobaron 6 solicitudes de crédito en las veredas de Calle Larga, San Antonio, Guadualito, Martha, San Vicente y La Concepción por un valor de \$8'850.380=, los cuales beneficiaran a 19 familias.

3.2. PROMOCION COMUNITARIA Y ASISTENCIA SOCIAL

3.2.1. ZONA 01 - PUERTO MERIZALDE

- Asesoramiento a 5 Unidades Económicas de Pesca U.E.P. sobre responsabilidad mancomunada y reubicación de equipos en las veredas de Concherito, La Vuelta y Puerto Merizalde.
- Acompañamiento a compras para 2 grupos de escaladoras de pescado seco - salado, existiendo buen comportamiento frente al pago y retorno del crédito.
- Promoción y organización de la Asamblea de Constitución de la Asociación de Pescadores Artesanales del río Naya (ASOPARNA) con la participación de 40 socios fundadores, apoyándose la elección de la Junta Directiva y Junta de Vigilancia y nombrándose un pescador de ASOPARNA para que trabaje conjuntamente con el administrador que designe el Proyecto para el manejo del Centro de Acopio de Pesca.
- Se apoyó la evaluación socio - económica de la empresa comunitaria de San Miguel, la cual está constituida por 19 socios que en su mayoría están incapacitados de desarrollar actividades por enfermedades en el mantenimiento de la cocotera, teniendo una morosidad frente al crédito, por lo cual la asesoría está dirigida a mostrar la situación crítica de la empresa y la responsabilidad de cada uno de los socios. Se elaborará un plan para la vinculación de nuevos socios y la reactivación de la Junta Directiva.
- Se promocionó el taller para los grupos de crédito de mantenimiento de coco donde se les recalcó sobre la responsabilidad mancomunada.
- Con los Promotores Veredales se viene trabajando una guía organizativa

de grupos, la cual permitirá que los Promotores Veredales tengan elementos básicos que les permita brindar asesoría organizativa a los grupos de hecho.

Asistencia a las Tiendas Comunitarias y a la Tienda Líder.

- Al cumplirse un año del programa de Tiendas Comunitarias, se promocionó y se realizó la elección de la Junta Directiva, para el período agosto/91 - agosto/92, haciendo énfasis en las funciones de cada uno de los Directivos del trabajo en equipo para dirigir y planear las actividades encaminadas a conformar la Asociación de Tiendas Comunitarias.
- Se está trabajando con 10 Tiendas Comunitarias : El Trueno, El Pastico, Puerto Valencia, Puerto Merizalde, San Martín, San José, El Alambique, San Miguel, Joaquincito y Resguardo Indígena, a los cuales se les ha brindado apoyo en la aplicación de formatos de registro diario, elaboración de balances generales, observándose apropiación de los términos y el significado de formatos y estados financieros.
- Se realizó un taller para 5 miembros de cada Tienda Comunitaria sobre la relación asociativa entre la Tienda Líder y la Comunitaria, con lo cual se logró la responsabilidad de cada Tienda frente al buen funcionamiento de la Tienda Líder reflejándose en el aporte de material para la obra de infraestructura de esta.
- Con el objeto de definir la situación Jurídica de la Asociación de Tiendas Comunitarias se apoyó el estudio de los estatutos con los delegados de las Tiendas Comunitarias, quedando pendiente el análisis de los mismos con los socios de las Tiendas existentes.

Asesoría a Representantes y Promotores Veredales

- Con los Representantes y Promotores Veredales se han venido desarrollando temas en lo relacionado a procesos de participación y organización comunitaria, en los cuales se han trabajado:
 - . Inventario y priorización de necesidades comunitarias.
 - . Importancia de la coordinación de reuniones entre el Promotor Veredal y el Promotor Social.
 - . Cómo hacer reuniones comunitarias.
 - . Listado en orden de prioridades sobre solicitudes de microrealizaciones de las 24 veredas, teniendo en cuenta: veredas no atendidas y la urgencia de la obra.

Otras Actividades

- Apoyo a los grupos juveniles de Puerto Merizalde y San Joaquín.

3.2.2. ZONA 02 - SAN FRANCISCO Y ZONA 03 - LA CONCEPCION.

Tiendas Comunitarias.

- Se realizaron 7 reuniones con los socios de la Tiendas Comunitarias de las veredas: Corrientes, Dos Quebradas, San Francisco, Santa Cruz de Golondros y San Lorenzo, trabajándose en reglamento interno,

inventario, balances y estado de organización interna de los socios como grupo. La gran dificultad es el alto porcentaje de analfabetismo, que no permite asumir la administración de la Tienda y la apropiación de la capacitación que se brinda para un buen manejo de la Tienda.

- Se efectuó una reunión con Representantes de la Tienda Líder en la cual se analizaron los estatutos para conformar la Asociación de Tiendas, quedando pendiente analizar con los socios de cada Tienda y decidir reformas sobre los estatutos y la afiliación a la Asociación.

Minería.

- Se realizaron capacitaciones para nuevos beneficiarios de crédito en las veredas de Calle Larga y San Antonio, capacitándose 11 beneficiarios (2 grupos de mujeres), en La Concepción a 3 grupos (15 beneficiarios) a los cuales se les explicó sobre el Proyecto, los P.P.P. y se hizo énfasis en la responsabilidad mancomunada.

Agricultura.

- Se realizaron reuniones con Promotores y Representantes Veredales para la conformación de nuevos grupos de crédito en las veredas de Juan Nuñez, La Bartola, Calle Larga, San Antonio y El Carmen.
- Se hizo promoción y capacitación a 12 futuros beneficiarios en las veredas de El Carmen, San Antonio y Juan Nuñez sobre los P.P.P. y la responsabilidad mancomunada.
- Reunión con 25 agricultores de la vereda de Santa María para realizar

asistencia sobre macomunalidad y problemas con miembros de grupos que no están cumpliendo con las labores para el buen manejo del crédito.

Microrealizaciones.

- . Vereda de Dotosa: Selección del lote y reunión comunitaria para organización de grupos de trabajo.
- . Santa Cruz de Golondros: Organización de grupo de trabajo para la construcción de la Tienda Comunitaria.

Asesoría a Promotores y Representantes Veredales.

- . Se realizaron 3 reuniones de programación con Representantes Veredales a los cuales se les reforzó sobre funciones y la asistencia social que deben empezar a hacer con los grupos.
- . Se realizaron 2 reuniones con Representantes Veredales donde se les ha capacitado en sus funciones, análisis de las microrealizaciones en cada vereda y la situación actual del Proyecto.
- . Se realizaron 3 capacitaciones a Representantes Veredales para dar información sobre "CREDIPACIFICO" (Representantes de la zona 02 y 03), con el apoyo del asesor en Asociativismo y una capacitación "Cómo hacer reuniones".

3.3. CREDITO Y CAPACITACION SOCIO EMPRESARIAL

Solicitudes de Crédito.

- . Análisis de rentabilidad y aprobación de 6 créditos de minería de las zonas 02 y 03 por un valor de \$8'850.380.oo.
- . Análisis de rentabilidad y aprobación de 6 créditos de mantenimiento de coco por valor de \$11'709.996.oo.
- . Análisis y aprobación de refinanciación en pesca por valor de \$512.238.oo, vereda de Santa Cruz.
- . Acompañamiento a compra a beneficiarios de crédito en minería.

Capacitación.

- ± Se realizaron talleres de capacitación a beneficiarios sobre manejo de crédito a:
 - . Grupos de minería de las veredas: Guadualito, Martha, San Vicente y La Concepción.
 - . Grupos de agricultura (mantenimiento de coco).
- . Taller de capacitación contable a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito (CREDIPACIFICO).
- . Evaluación de cartillas para capacitación contable con socios de las Tiendas Comunitarias.

- . Capacitación a empresa comunitaria de San Miguel (administración y ventas).
- . Capacitación a la nueva Junta Directiva de la Tienda Líder sobre: Balance General, compra de bienes básicos y funciones de cada miembro.
- . Seguimiento y balance de Tiendas Comunitarias de San Francisco, Dos Quebradas, Corrientes y San Lorenzo.

3.4. MICROREALIZACIONES

- . Actualmente en el tercer trimestre julio 1 a septiembre 30 el Proyecto ha contemplado una serie de obras a costo total como son campamentos (ampliación) y Centro de Acopio de Pesca, por lo cual se ha priorizado el apoyo logístico (transporte, personal técnico y contratistas) sobre estas obras y algunas microrealizaciones de la zona 01; además el abastecimiento de materiales por parte del Aserrío proveedor y administración Cali ha presentado dificultades por el continuo desperfecto mecánico de los motores de las lanchas, lo cual ha ocasionado retraso en algunas obras de participación comunitaria y su avance ha sido mínimo respecto al trimestre anterior. Por ello sólo se informará sobre el avance de las obras donde se ha trabajado.

3.4.1. OBRAS CON PARTICIPACION COMUNITARIA

- . Hogar Infantil de El Cacao II parte
Avance de la obra 90%.
- . Tienda Comunitaria de El trueno
Avance de la obra 60%.

- . Cancha multiusos de Puerto Merizalde.
Avance de la obra 90%
Pendiente colocación de tableros.

- . Tienda Líder de Puerto Merizalde.
Avance de la obra 90%
Pendiente instalaciones eléctricas e hidráulicas.

- . Biblioteca Patricio Olave en Puerto Merizalde.
Avance de la obra 40%.

3.4.1.2. ZONA 02 - SAN FRANCISCO

- . Embarcadero de San Francisco.
• Avance de la obra 100%.

- . Tienda Comunitaria de Santa Cruz de Golondros
Avance de la obra 50%.

3.4.1.3. ZONA 03 - LA CONCEPCION

Debido a las consideraciones expuestas, no se han podido atender las microrealizaciones aprobadas.

3.4.2. OBRAS A COSTO TOTAL

- . Centro de Acopio de Pesca.
Avance de la obra 80%
Pendiente instalaciones hidráulicas, eléctricas, tanque almacenamiento de agua y muelle.

. Ampliación campamentos

Avance de la obra 80%

Pendiente instalaciones hidráulicas, eléctricas, tanque
almacenamiento de agua, acabados generales.

. Laboratorio para planta de procesamiento de Productos (P.P.P).

Avance de la obra 90%.

3. RIO MICAY

RESUMEN DEL TRIMESTRE

Enmarcados en los procesos de cogestión hacia la autogestión, se desarrollaron las actividades de Asistencia Técnica y capacitación en este trimestre.

Los procesos participativos de las comunidades influenciadas, se adelantaron a través de los Talleres de Planeación Participativa dirigida a Objetivos, (P.P.O.) mediante los cuales se logró definir la priorización de necesidades en las áreas de intervención del Proyecto, y plantear los ajustes por parte de los equipos de trabajo, para el alcance de los objetivos del Proyecto .

La participación de Promotores Veredales, Representantes Veredales y miembros de la comunidad en las labores de capacitación grupal, días de campo, giras han sido parte importante de todo este proceso.

Asistencia Técnica Agrícola

Agroforestería

Previa la unificación de la propuesta Agroforestal por parte de los equipos técnicos y Socioempresariales de los tres ríos, se desarrolló la actividad de atención de solicitudes de créditos nuevos y refinanciaciones. Esta actividad tuvo como base los cupos asignados y el trabajo desarrollado de selección y reestructuración de grupo, por parte del componente social; en este último trabajo se tuvo en

cuenta el grado de participación de los beneficiarios en las labores de capacitación y asistencia técnica dados por el grupo de extencionistas del proyecto.

COCO

Atención a Agricultores con crédito para mantenimiento del Coco

Entrega del primer desembolso a 18 grupos de beneficiarios de crédito para mantenimiento de coco e inicio y seguimiento de las labores agrícolas programadas por parte del técnico agrícola y los Promotores Veredales.

Seguimiento del estado de las fincas, verificación del desarrollo, evaluación de la producción de fincas pertenecientes a los primeros créditos (44 beneficiarios).

Investigación sobre el Barrenador del Fruto del Chontaduro

Se continuó con la evaluación de los ensayos teniendo en cuenta las recomendaciones del Entomólogo del ICA Adolfo Trochez, previéndose una segunda etapa de este proceso de investigación programada para el próximo trimestre con base al análisis y diseño a desarrollar por parte de este funcionario.

Asistencia Técnica en Pesca

La gestión de este período estuvo centrada en la evaluación de la situación crediticia, el análisis del estado de los grupos y su actividad productiva. La utilización de procesos legales permitidos por el reglamento de crédito como el de solicitudes de dación en pago,

garantizó dar inicio a los procesos de saneamiento de la cartera mediante la devolución voluntaria de los equipos no explotados adecuadamente.

Alternativas de diversificación pesquera, mediante la utilización de otros equipos de pesca como la vela, permitieron generar con la participación comunitaria, otras alternativas en la búsqueda de soluciones al estancamiento del desarrollo de la pesca artesanal.

Asistencia Técnica Minera

A través del intercambio de experiencias mediante la realización de giras de inspección a los frentes de trabajo, se logró una mejor apropiación de la técnica del lavado del oro mediante el sistema de canalón en la comunidad de San Valentín, con base en las experiencias del corregimiento de Chuare.

La participación comunitaria desarrollada por los mineros ha permitido la necesidad de consolidarse como grupo a través de la conformación de una Asociación de Mineros la cual se protocolizará a principios del próximo trimestre.

La formación de Comités de participación Comunitaria en las Microrealizaciones aprobadas para este sector Productivo, ha sido una forma de expresar el Desarrollo de Actividades de grupo por parte de estos Asociados.

Asistencia Técnica Crediticia.

Presentaciones de solicitudes de crédito con base en los cupos asignados para el Río, teniendo en cuenta las recomendaciones

de los equipos técnicos en las áreas de Agroforestería, mantenimiento de coco y Minería; modificaciones de los planes de pago con base en los conceptos técnicos consolidados y estructuración de propuestas crediticias de acuerdo a las necesidades de cada área productiva.

Promoción Comunitaria

Orientada hacia la autogestión y cogestión mediante el estímulo a formas propias de participación comunitaria, se han conformados comités de apoyo a las Microrealizaciones los que garantizan una planeación y un tiempo de ejecución de acuerdo a la Proyección diseñada por los técnicos responsables.

En los procesos de transferencia de tecnología ha sido importante la participación de los Promotores Veredales, teniendo en cuenta las recomendaciones técnicas dadas por el grupo de extensionistas.

El establecimiento de acuerdos para el estricto cumplimiento de la mancomunidad por parte de los integrantes de los grupos, ha permitido ir dando soluciones a situaciones de falta de funcionabilidad de este mecanismo.

Asistencia Técnica en Comercialización

Acompañamiento a las diferentes Asociaciones de productores existentes en el río en actividades de compra y comercialización de productos. Localización de otros mercados potenciales, teniendo en cuenta las recomendaciones del experto en Comercialización.

Capacitación de los Asociados en las áreas de manejo contable.

Asociativismo

Con la participación del experto en Cooperativismo se logró contribuir a la fundación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Credipacífico", la cual a mediano plazo manejará los recursos del Fondo Rotatorio.

De la Junta Directiva hacen parte 3 miembros pertenecientes a Asociaciones existentes en el río.

Asistencia Técnica de Motosierrero.

El trabajo de asesoría se efectúa de una manera muy puntual debido a que ésta actividad es desarrollada en forma dispersa por parte de los beneficiarios de crédito.

Se adelantó ante el Comité de Crédito una solicitud de refinanciación la cual no fue aprobada.

Es necesario definir por parte del Proyecto una estrategia clara y consolidada que permita manejar con mejores criterios este sector Productivo.

Microrealizaciones

Conformación de Comités de apoyo a Microrealizaciones, los cuales permiten evaluar la gestión desarrollada por el Proyecto y medir el grado de participación de la Comunidad. En la zona Minera ha venido funcionando este mecanismo con buenos resultados.

En las Comunidades Indígenas el nivel de participación es alto y dinámico, acorde con la definición de prioridades productos de los Talleres de Planeación de Proyectos orientados a Objetivos (P.P.O.) desarrollados en este trimestre.

Coordinación Interinstitucional

A través del Convenio con la Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca, continúa al apoyo con un funcionario (Técnico Agrícola) en Zaragoza.

Con el ITA de Buga (Instituto Técnico Agrícola) continúa la pasantía de un Técnico Agrícola.

Con el ICA se continúa el desarrollo del Programa de Investigación para control del barrenador del fruto del chontaduro.

Con el INCORA se han hecho visitas, de inspección a las Comunidades Indígenas de Guayabal, Juan Cobo y San Francisco de la Vuelta para definir aspectos de legalización de Resguardos.

El IGAC (Instituto Geográfico Agustín Codazzi) realizó visita de avalúo del área correspondiente al resguardo de Juan Cobo.

El PNR (Plan Nacional de Rehabilitación) realizó una reunión con la asistencia del Director Regional del PNR, Cauca y el Coordinador PNR, para Guapi, Timbiquí y Micay, con el fin de analizar las proyecciones de este programa en el área de jurisdicción del Proyecto en el departamento del Cauca.

3.1. Asistencia Técnica

3.1.1. Asistencia Técnica en Agricultura

3.1.1.1. Zona # 04 - Noanamito

- Seguimiento general y paralelo con los Promotores y Representantes Veredales en el sector agrícola, con visitas de Asistencia Técnica en sus respectivas fincas; esto con el objeto de lograr una información


ASISTENCIA TECNICA SEGUIMIENTO GENERAL

Vereda	Nº Grupos	Nº Flias. Beneficiadas	Cultivos	Area General Cultivada	O b s e r v a c i o n e s
Laguna San Pablo	19	57	Plátano- borojón- caña-chontaduro Maderables - Papachina- Leguminosas	57 Has.	Sistemas agroforestales en desarrollo y mayor establecimiento del cultivo de borojón.
San José del Trapiche	14	33	Plátano- Papachina (Borojón - Chontaduro)	40 Has.	Cultivos Asociados (plátano- papachina) con cambios hacia el sistema Agroforestal.
Comunidad Indígena Juan Cobo San Fco. de la vuelta.	4	12	Chontaduro -plátano- banano- caña - borojón -leguminosas -maderables.	12 Has.	Sistemas Agroforestales establecidos en proceso; pendiente apoyo crediticio al sector agrícola Indígena San Fco. de la Vuelta.
Bocagrande (Cocoteros)	1	44	Coco	240 Has.	Asociación cocoteros. Asistencia Técnica -Mto. en el cultivo del coco en lotes de no producción y producción.
Santa Ana	25	70	Maderables - banano - plátano -chivo- Chontaduro - Borojón - Leguminosas.	70 Has.	Vereda beneficiada en Asistencia Técnica y 10 grupos iniciales pendientes de apoyo crediticio.
Bocagrande Brazo- Coco Punta- Coco Guacarf La Capilla Juan Cobo Sta. Ana Candelaria Indígenas	21	73	Coco - Asociados con Leguminosas	205 Has.	Capacitación - Asistencia Técnica del Proyecto mantenimiento en el cultivo de coco asociados con leguminosas. Créditos aprobados - 100% (21 grupos). Pendiente segundo desembolso.
TOTALES	84	289	- 0 -	624 Has.	- 0 -

precisa que permitiera programar una capacitación en cuanto al apoyo en sistema crediticio de refinanciación, reestructuración, la situación de responsabilidad mancomunada y otros temas que son prioritarios dentro de la solicitud de créditos agrícolas.


- Análisis y evaluación en los diseños de ensayos de campo, en cuanto a fertilización en el cultivo de coco y el control de ataque del barrenador en el fruto del chontaduro.
- Realización de encuestas y su respectivo análisis sobre la producción en cultivos de borojó y papachina, con el objetivo de lograr un canal de comercialización a favor del beneficiario.
- Participación en el análisis de un trabajo de equipo con la propuesta del cronograma presupuestal en los sistemas agroforestales.
- Apoyo en el análisis y gestiones locativas para proyectarlas con base a un plan operativo años (91-92).
- Asistencia Técnica - (capacitación) a nuevos beneficiarios de créditos agrícolas para mantenimiento de plantaciones cocoteras en producción. En respuesta a ello se diligenciaron solicitudes de créditos. Una vez aprobadas, se realizó un acompañamiento para inicio de labores y la entrega del primer desembolso de dichos créditos.
- Participación en gira realizada en el sector del Bajo Calima - San Juan - Universidad del Tolima - CONIF, realizada con el objetivo de generar un análisis comparativo en cuanto a sistemas agrícolas, ítem y recursos utilizados en dicha zona con sus respectivos trabajos de investigación que se gestionan en estos sectores.
- Anexos.

P.P.P. - C.V.C. - C.E.E.
AGRICULTURA - RIO MICAY
COBERTURA ZONA No. 04 (PARTE BAJA) NOANAMITO


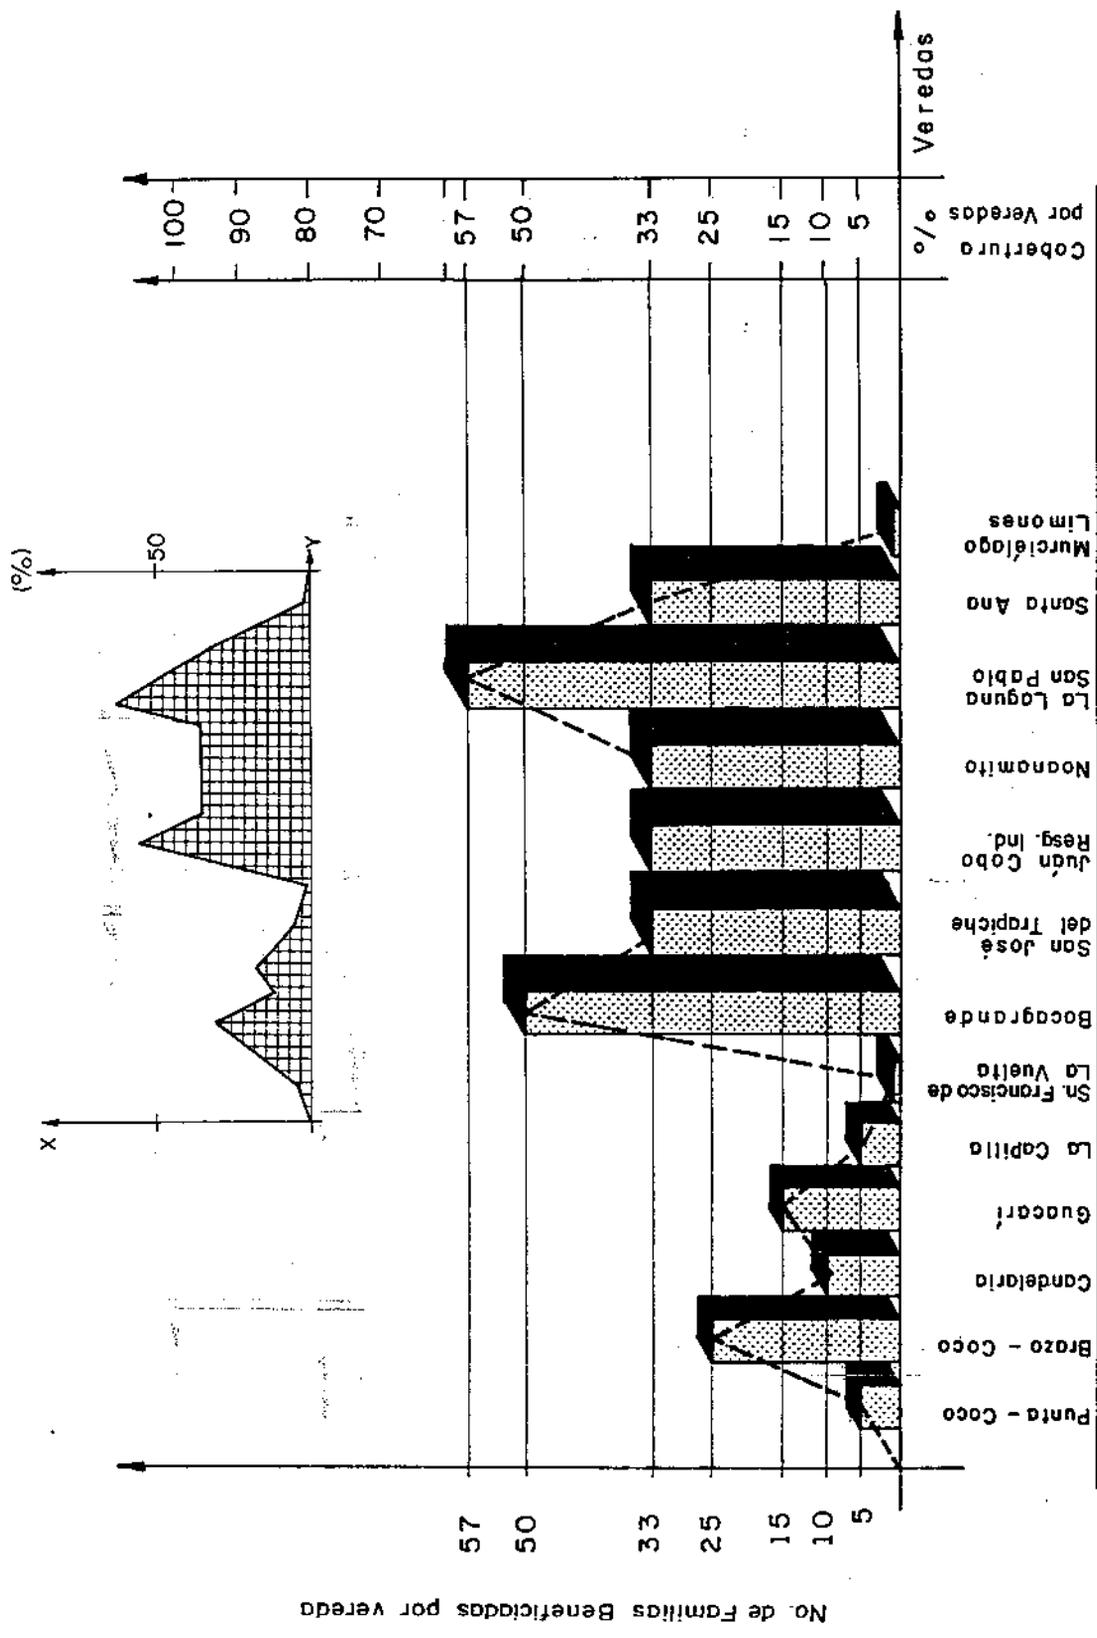


NOTA : No. de familias beneficiadas 299
 No. de familias de diferentes veredas en 5
 proyección a beneficiar.
 Total familias 304

P.P.P - C.V.C. - C.E.E.
AGRICULTURA - RIO MICAY
ZONA No. 04 (PARTE BAJA)
89-90-91

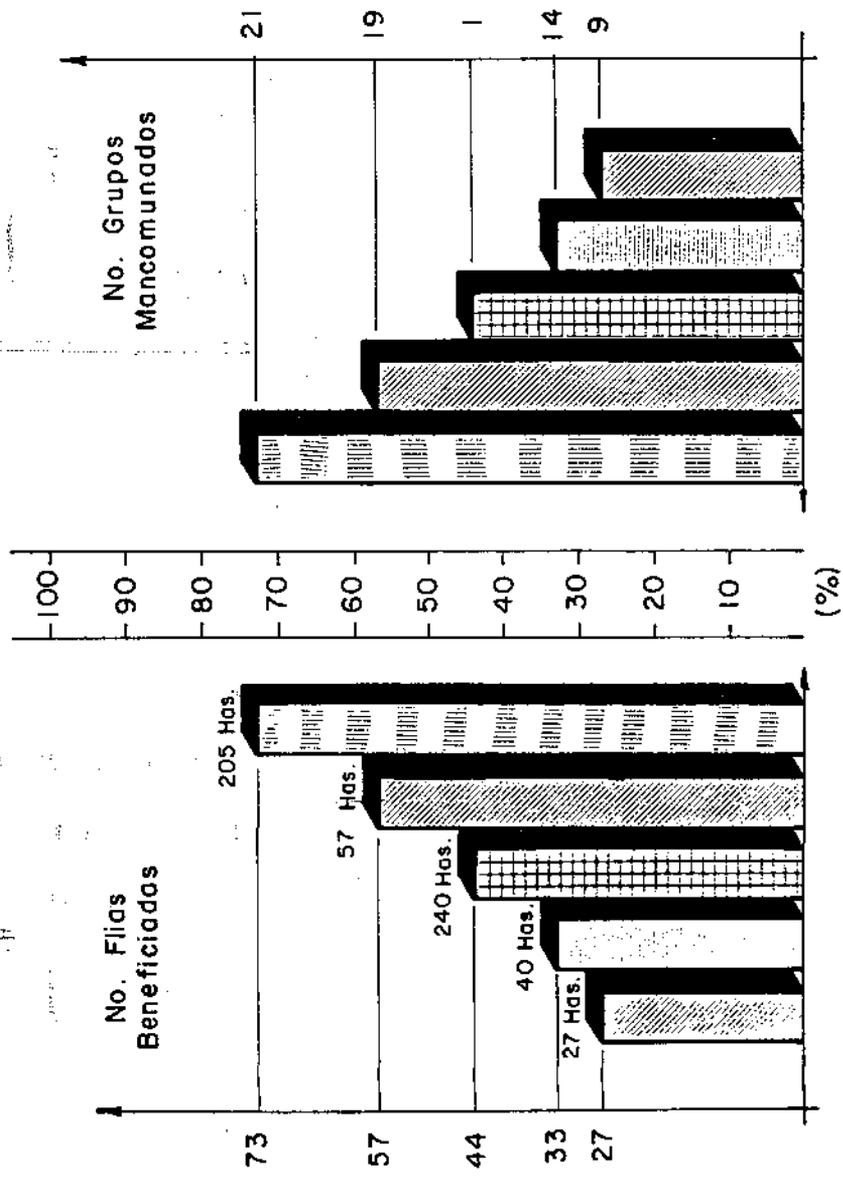

P.P.P. - C.V.C. - C.E.E.
AGRICULTURA - RIO MICAY
 ZONA No. 04 (PARTE BAJA)
 PROYECCION AÑO 91-92-93

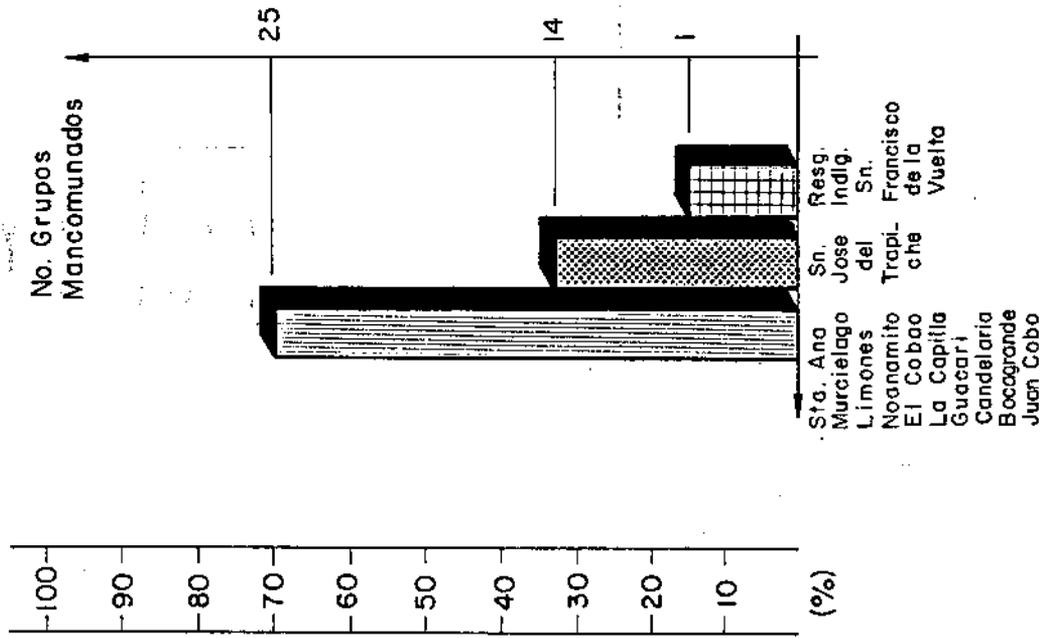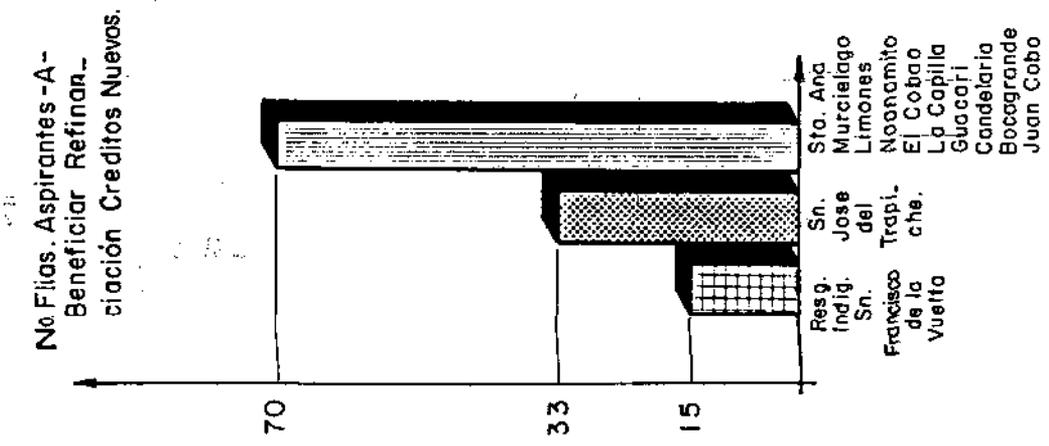

Creditos.
 Mantenimiento en Cultivo de Coco - Asociados con Leguminosas - (en Producci3n).
 (1 Grupo - Indigena)

Creditos.
 (Refinanciaci3n - Reestructuraci3n).
 de Cultivos Asociados (Platano - Papa china).
 - A - Sistemas Agroforestales (Borojo, Chontaduro, Leguminosas).
 Se inicio con 7 Grupos y 22 Beneficiarios.

Creditos (Nuevos).
 Sistema Agroforestal. (Borojo, Chontaduro, Leguminosas).

1. Cobertura total de asistencia técnica- (agrícola) zona # 04 - (parte baja).
 - a- No. de familias beneficiadas por veredas.
 - b- Porcentaje (%) - de cobertura por vereda.
2. No. de familias beneficiadas - (año - 89-90-91).
No. de grupos mancomunados.
3. Proyecciones (año 91-92-93).
 - a- No. de familias aspirantes a beneficiar en :
 - Refinanciación
 - Reestructuración
 - Créditos nuevos
 - b- No. de grupos mancomunados

3.1.1.2. Zona 05 Zaragoza

Promoción e implementación de semillas y viveros de borjón y leguminosas en las 14 comunidades que atiende el Proyecto con asistencia técnica o créditos localizados en la zona media; Isla de Gallo, Canelarga, Taparal, San Joaquín, Casas Viejas, Barranco, Arenal, Zaragoza, Iguana, Bujío, Belén de Iguana, Rotura, Río Viejo y Guayabal, contando con la participación de los técnicos del Proyecto y los 12 Promotores Veredales de la zona.

- Acompañamiento técnico a agricultores en labores de adecuación de lotes de bosques primarios y la sucesiva instalación de borjón, chontaduro y leguminosas. Desarrollo de estas actividades en bosques secundarios y en fincas en procesos de transformación de sistemas asociados a

COBERTURA

ZONA 05 - ZARAGOZA

Comunidades	# Agricultores con A.Técnica	# Agricultores con Crédito Agríc.	# Agricultores a refi-nanciar con Agroforest.	# Agricultores inváli-dados para refinanciac.	# Agricultores a refi-nanciar y atender con nuevos cré-ditos	# Plántu-las de borojó en viveros y semilleros	# Plantas de borojó sembradas	# Has de borojó sembradas	Observaciones
Guayabal	26	0	0	0	26	12.500	1.000	1.0	Los 26 agricultores ya presenta-ron la solicitud y están pendien-tes de aprobación.
Río Viejo	21	0	-	-	21	8.000	500	0.5	Hay 21 aspirantes a crédito, se está tramitando la papelería.
Rotura	65	75	64	11	64	37.000	500	0.5	Refinanciación.
Belén de Iguana	16	0	-	-	16	800	-	-	Hay 16 aspirantes a crédito.
Bujío	26	28	26	2	26	13.500	500	0.5	Refinanciación.
Iguana	18	21	18	3	18	5.000	4.000	4.0	Refinanciación.
Zaragoza	50	74	50	24	50	20.000	5.000	5.0	Refinanciación.
Arenal	22	0	-	-	22	2.000	-	-	Hay 22 aspirantes a crédito.
Larrancos	22	1	1	-	22	3.200	500	0.5	Hay 22 aspirantes a crédito.
Las Viejas	8	3	3	-	08	000	500	0.5	Hay 5 aspirantes a crédito y 3 para refinanciación.
San Joaquín	27	0	-	-	27	1.000	1.000	1.0	Hay 27 aspirantes a crédito.
Aparal	8	12	8	4	8	1.000	-	-	Refinanciación.
Calle Larga	16	16	-	16	-	-	-	-	
Isla de Gallo	52	52	26	26	26	4.000	500	0.5	Hay 26 agricultores para refinanciación
Total	377	282	196	86	334	110.000	14.000	14	

sistemas agroforestales. Estas actividades han sido de gran importancia por ser desarrolladas a través del proceso de autogestión, por parte de los agricultores, a partir de promoción del modelo agroforestal, días de campo y asistencia técnica.

- La consecución de semilla, adecuaciones de terrenos y siembra en algunos casos son realizados en base a sus propios esfuerzos.
- Se han sembrado 7 hectáreas agroforestales, existiendo 14 en proceso de implementación con maderables.
- Se desarrollaron días de campo en las comunidades de Guayabal y Rotura con agricultores beneficiarios y aspirantes a créditos. Con los Promotores Veredales se ha planificado el montaje de 12 parcelas demostrativas de 1/2 hectárea cada una, con el fin de desarrollar programas de transferencia de tecnología y entrenarlos en la utilización de los materiales didácticos, como cartillas y maquetas agroforestales.
- Se continuó con el seguimiento sobre investigación del barrenador del fruto del chontaduro; se terminó la primera etapa consistente en el embolsado de inflorescencias, después de la antesis (fecundación y caída de la flor masculina). En esta experiencia se observaron 3 estados en el desarrollo del Insecto plaga (huevos, larva y adulto). Los procesos de identificación taxonómica son adelantados por un Entomólogo del ICA, con el cual se desarrollará la segunda fase de la investigación, programada para el próximo trimestre.

3.1.1.3. Zona 06 López de Micay

Prestación de asistencia técnica a 79 beneficiarios en proceso de transformación del modelo de cultivos de plátano y papachina al

agroforestal, con participación de los Promotores Veredales de Chuare, San Isidro y Cabecitas del Sigüí. Actualmente se han seleccionado 7 grupos para refinanciación, ubicados en las veredas de San Antonio de Chuare y San Isidro. Las jornadas de capacitación han contado con la participación del componente social para el análisis de compromisos de responsabilidad mancomunada.

- La estrategia para el desarrollo agroforestal se maneja mediante dos niveles:

Grupos a refinanciar	Aquellos grupos que habían sido beneficiados para los cultivos asociados.
----------------------	---

Nuevos créditos	Aquellos grupos que conforman la nueva cobertura del Río Sigüí.
-----------------	---

Por otra parte se da comienzo a la ampliación del Convenio, en cuanto a cobertura se refiere con la intervención en el Río Sigüí, este afluente del Río Micay presenta:

Suelos	-----	* Ligeramente ácidos
M.O.	-----	* Con un porcentaje entre medio o alto contenido.
P.Ca.K	-----	* Con un porcentaje Bajo contenido
Mg	-----	* Con un porcentaje medio de contenido
Al	-----	* Alto contenido (en la vereda de Cabecitas).

* Esto de acuerdo al análisis de suelos llevados al ICA-Palmira.

En cuanto al programa de acompañamiento al desarrollo de actividades

en la zona minera, y orientado a estructurar un programa de manejo de cuencas, se pretende adelantar un programa de repoblación de estos suelos degradados, mediante la siembra de leguminosas y el manejo de barbecho para recuperación de los suelos.

3.1.2. Asistencia Técnica en Pesca

3.1.2.1. Zona # 04 - Noanamito

- Dentro de la estrategia definida a través del plan de reestructuración programado con participación de la sub-dirección, el técnico pesquero y el componente social, se adelantó la programación a través de la cual se desarrollaron los siguientes aspectos:
- Análisis del estado crediticio de los grupos beneficiarios, tendientes a establecer el estado financiero de ellos y el estado real de los equipos; producto de esto se han adelantado programas de capacitación y mantenimiento de equipos y el diseño de alternativas para pesca de altura.

Dentro de las alternativas de diversificación en pesca, se presentó la propuesta de velero a la cual se le asignaron recursos y se da inicio a la participación de la comunidad; se está planeando su materialización.

Se adelantarán programas orientados a estimular el desarrollo de la pesaca de altura a través de la utilización de una embarcación nodriza y embarcaciones acompañantes en número de nueve(9) y con una intensidad de cinco(5) días promedio. El producido se comercializará teniendo en cuenta el mercado.

3.1.3. Asistencia Técnica Minera

3.1.3.1. Zona 06 - Zona Alta

Asistencia Técnica

Ampliación de cobertura a un número de 200 familias que incluye las veredas de Nacioná, Nayita y López.

Dentro de los procesos de transferencia de tecnología orientados a garantizar una mayor eficiencia en la extracción del oro, se inició un trabajo técnico a través de la utilización del lavado mediante la utilización del canalón, usado correctamente por los mineros de Chuare y replicado por los de San Valentín, quebrada de Chambón; a mediano plazo se pretende adelantar el programa de utilización del canalón por sistema compuesto; se adelantó el análisis y evaluación de cartillas didácticas elaboradas por el equipo de comunicaciones, con participación de diferentes grupos mineros de la zona.

Se adelantan gestiones ante Siolidarios tendientes a unificar criterios de cobro de las cuotas de acuerdo a los planes establecidos y verificación correcta de los abonos respectivos, mediante la utilización debida de las solicitudes de prórrogas para lo cual se adelantan gestiones con el Coordinador del Fondo Rotatorio de Crédito.

3.1.3.2. Capacitación

Ha estado orientada a darles mejores elementos de trabajo a los Promotores Veredales con el fin de que ellos puedan transferir el conocimiento dado por el técnico, pues realmente este es el único mecanismo que garantiza ampliación de cobertura y asistencia técnica a los establecidos.

- Se adelantaron talleres de Planeación de Proyectos orientada a Obejetivos, a través de los cuales se logró priorizar la intervención del Proyecto y las expectativas de las comunidades.
- Con el asesor en asociativismo se realizó un taller sobre éste tema con participación de los mineros ubicados en las veredas donde se adelanta el programa de minería y se dieron los pasos para garantizar la formación de la Asociación de Mineros, a consolidarse el próximo trimestre; se tiene proyectada la participación de 130 socios fundadores.

A la Asociación se le asignará un recurso para la instalación de una bodega de combustible mediante un Crédito de \$5'000.000=; y a través de micronealizaciones se adelantan programas de construcción.

Se pretende durante el próximo trimestre atender con asistencia técnica a 5 grupos localizados en la vereda Nayita.

3.2. Asistencia Socioempresarial y Crediticia.

3.2.1. Zona Baja - 04

3.2.1.1. Proyectos Agrícolas.

- Unificación de la propuesta agroforestal con el equipo técnico de los tres ríos; esta propuesta permitirá refinanciar los beneficiarios de crédito en sistemas asociados y otorgar nuevos créditos agrícolas; la misma asciende a los siguientes montos:
 - . Refinanciaciones \$759.033=
 - . Créditos nuevos \$880.033=
- Análisis de rentabilidad para 7 Créditos de la vereda San José del Trapiche (Refinanciaciones); estos Créditos benefician a un total de 22 jefes de familia y ascienden a un valor de \$16'698.726=.
- Entrega del primer desembolso a 18 grupos beneficiarios de Crédito para

- mantenimientos de coco; quedaron pendientes tres grupos por falta de documentación.
- Elaboración de los planes de pago individuales y consolidados para los 21 grupos beneficiarios de Crédito en mantenimiento de coco, acogiéndose a las recomendaciones del Comité de Crédito.
- Elaboración de nuevos planes de pago a 7 beneficiarios de Crédito para mantenimiento de coco (antiguos) y entrega del segundo desembolso a estos 7 beneficiarios.
- Solicitud del tercero y cuarto desembolso para los 19 grupos de la vereda La Laguna por valor de \$9'648.085=

3.2.1.2. Proyectos pesqueros.

- Asesoría a los grupos que han presentado problemas y seguimiento al crédito en algunos casos específicos.
- Solicitud de refinanciación para un grupo de beneficiarios de crédito al cual le fueron sustraídos los artes de pesca (malladores).
- Situación crediticia con Solidarios de algunos grupos que han entregado equipos como adición de pago.

3.2.1.3. Comercialización

A.- Tiendas Comunitarias (Asopomy).

- Durante el período Asopomy realizó dos remesas, en una de las cuales se efectuó acompañamiento por parte del Socio-empresarial (agosto 8 al 10) con las respectivas actividades que implica el acompañamiento. Este acompañamiento se ha tratado de disminuir, pero debido a los problemas de descapitalización que afronta la Asociación, la Junta Directiva la

ha considerado necesaria.

Se realizó una Asamblea de Asopomy en cada período, con el propósito de hacerle un seguimiento permanente debido a la situación financiera y a los problemas que afronta. A éste respecto se ha recomendado:

- . Nombrar un Representante de Asopomy en cada zona.
- . Abolir el fiado en las Tiendas Comunitarias, así como eliminar la traída de remesa a las Tiendas que tengan deudas pendientes con la Asociación.
- . Examinar permanentemente la situación de cada una de las Tiendas y determinar fechas para el cumplimiento de las obligaciones de cada una de ellas con la Asociación.
- . Se ha solicitado un listado de deudores morosos a las Tiendas, con el fin de reseñarlos en los procesos crediticios que adelanta el Proyecto.
- . Examinar el funcionamiento operativo de la Junta Directiva, el cual lo ha venido asumiendo sólo el Presidente y el Tesorero de la misma.
- Reunión con el Asesor en Comercialización con el Presidente de Asopomy en la cual se definieron los conductos a través de los cuales se podrán obtener mejores precios para los productos vía Cali.

B. Asociación de Cocoteros (Aprocobomy)

- Se realizaron comercializaciones del Producto durante el trimestre (julio 10 y agosto 27), con una utilidad neta de 10.3% en cada una, (aproximadamente \$500.000.= de utilidad por comercialización).

Disminución en la utilidad con respecto a comercialización anteriores debido, al producto faltante y al que se deteriora (5.7% de las ventas totales).

C- Asociación de Mineros

Se definió la solicitud de crédito para comercialización de combustible por parte de la Asociación de Mineros; esta solicitud se haya sujeta a la construcción del Centro de Acopio y a la Asamblea de constiución legal de dicha Asociación.

3.2.1.4. Proyectos de Motosierras.

- Actualización de costos de producción de los motosierreros (trozas), con el fin de suministrar información al Asesor en comercialización.
- Solicitud de refinanciación para uno de los grupos de motosierra de la vereda Noanamito, ya que tanto el motor como la motosierra se hayan descompuestos.

3.2.1.5. Capacitación

- Dirigida a Promotores Veredales y Representantes Veredales con el propósito de ofrecerles elementos básicos sobre las condiciones de los créditos y capacitarlos en la elaboración de planes de pago. (Jornada con una duración de dos días).
- Dirigida a beneficiarios de crédito para mantenimiento de coco con el fin de explicarles las condiciones del crédito y la conformación de los planes de pago.

3.2.2. Zona 05 Zaragoza.

3.2.2.1. Proyectos Agrícolas.

- Análisis de rentabilidad a siete (7) solicitudes de crédito para sistema agroforestal (créditos nuevos); estas solicitudes benefician a un total

de 26 jefes de familia y son por un monto total de \$22'880.858=
Situación crediticia con Solidarios de los cuatro grupos de la vereda Iguana, los cuales serán objeto de refinanciación.

3.2.2.2. Capacitación

- Una jornada dirigida a socios de las Tiendas Comunitarias, la cual tuvo una duración de dos días y contó con la asistencia de 14 representantes.

3.2.3. Zona 06-López de Micay.

3.2.3.1. Proyectos Mineros.

- Ampliación de los planes de pago de 24 a 30 meses a 5 grupos beneficiarios de créditos aprobados en el trimestre, de acuerdo a decisión del Comité Orientador.
- Cotización de equipos de minería (dragas) para los grupos beneficiarios aprobados.

Se aclara la situación crediticia en Solidarios a algunos grupos que hallaron en sus recibos de caja, errores.

3.2.3.2. Proyectos Agrícolas.

Se clarifica la situación crediticia con Solidarios a 4 grupos de la vereda San Isidro; estos grupos serán objeto de refinanciación.

Análisis de rentabilidad a dos solicitudes de crédito; éstas se presentarán al Comité de Crédito en octubre.

3.2.3.3. Capacitación

- En cada período se realizaron jornadas de capacitación en cuatro de las seis Tiendas Comunitarias de la zona con el propósito de clarificar

problemas contables de las Tiendas y aspectos concernientes al atraso en los pagos a Asopomy.

3.3. Promoción Comunitaria, Labor Educativa Y Asistencia social.

3.3.1. Zona 04. Zona Baja.

3.3.1.1. Tiendas Comunitarias.

- Se ha hecho seguimiento a las Tiendas Comunitarias de las veredas La Capilla, San José del Trapiche y Noanamito, con especial énfasis en la reestructuración y organización de las tiendas de El Trapiche y La Capilla.

Se realizaron reuniones zonales con la participación de las Tiendas asociadas, con el objetivo de analizar el estado financiero de cada una de ellas ante la asociación y formular alternativas que permitan sanear la situación. Entre las alternativas formuladas se mencionan:

Determinación de planes de pago, según la capacidad adquisitiva de los socios morosos, para cancelar cualquier tipo de deuda establecida con la Tienda, antes de reglamentar la prohibición terminante del fiado.

Seguimiento periódico al cuadro de ventas diarias y mensuales.

- Reuniones mensuales de la junta Directiva con los socios para evaluar gestión, elaborar balance mensual, presentar informe de remesas y realizar ajustes generales.

- En términos generales, las actividades desarrolladas con las Tiendas han sido encaminadas a tratar de consolidar la organización interna de los asociados, debido entre otras cosas a la baja cohesión y sentido de pertenencia que existe entre los integrantes.

- Es de anotar que a pesar de haber realizado acciones que involucran tanto a la Asociación como a las Tiendas, la situación es preocupante y obliga a diseñar y realizar actividades de capacitación que contribuyan no sólo a mejorar organizadamente el grupo sino a elevar niveles de conciencia en las comunidades en torno al programa, sus objetivos, el compromiso y la participación de las veredas en él.

3.3.1.2. Asociativismo.

Con la Asociación de Tiendas Comunitarias del Río Micay (Asopomy), se efectuaron dos Asambleas en éste trimestre, destacándose los siguientes aspectos:

- Presentación y análisis estado económico y crediticio de las Tiendas asociadas tanto internamente, como ante la Asociación.
- Evaluación de la gestión de Asopomy con las tiendas socias; revisión de compromisos y cumplimiento.
- Definición de aportes y participación de las Tiendas asociadas en la construcción de la Tienda Líder y formulación de pautas para su administración.
- Se definió y programó como fecha para remesa el día siete de cada mes.

También y como proceso ya iniciado en éste trimestre, se está definiendo una estrategia que permita involucrar activamente a la directiva de Asopomy en el seguimiento Socio-económico de las Tiendas Asociadas y en el apoyo que estas demanden; según su situación particular.

- . Apoyo a la fundación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Pacífico "CREDIPACIFICO LTDA". Es de resaltar la participación de Representantes del Río en las diferentes instancias de la Cooperativa.

3.3.1.3. Seguimiento a Grupos de hecho

3.3.1.3.1. Agricultura

- El trabajo en este trimestre ha girado en torno a reuniones de información con agricultores, presentando el nuevo modelo Agroforestal

y analizando situación interna de los grupos aspirantes a refinanciación .

- Con los grupos se analizó el cumplimiento de algunos compromisos como la responsabilidad mancomunada y se formularon acciones de grupo tendientes a mejorar la dinámica interna. Como acción principal se acordó buscar y presentar garantías individuales que permitan ante dificultades o incumplimientos a la mancomunalidad materializar los acuerdos; ésto a través de un documento oficialmente diligenciado ya sea ante el Inspector de la localidad o el Notario y firmado por todas las partes.

3.3.1.3.2. Pesca

Las acciones desarrolladas con los grupos beneficiarios en esta área, han girado en torno a:

- . Actualizar el diagnóstico del estado tanto de los grupos, como de los equipos y estado crediticio.
- . Reunión con grupos que tienen equipos en mal estado, con el objetivo de plantear y discutir alternativas a su estado crediticio. Una de las alternativas contempladas, fue la entrega de equipos en dación en pago al crédito. Está pendiente de definir el estado crediticio ante entidad financiera. (Solidarios). de tres (3) grupos que entregaron parte de los equipos (Motores).
- . Taller de Evaluación con pescadores. Bajo la Coordinación del Subdirector del Convenio, se desarrolló diagnóstico de la situación en el área con la participación de pescadores, Representante y Promotor Veredal de la Comunidad de Punta El Coco zona pesquera.

3.3.1.4. Promoción de crédito

- Reuniones con aspirantes a créditos en sistema Agroforestal explicando propuesta y requisitos para acceder al crédito.

También se ha asesorado la conformación y reestructuración de los grupos, retomando criterios producto de reuniones y charla con beneficiarios y elementos tradicionales y culturales de las zonas.

Se han efectuado reuniones con grupos de agricultores en las Veredas Guayabal, Río Viejo, Rotura, Iguana, Zaragoza y Santa Ana.

3.3.1.5. Promoción Comunitaria.

- Reuniones periódicas con Promotores Veredales, analizando y ajustando trabajo desarrollado con las comunidades y los grupos y revisando necesidades de capacitación en diferentes aspectos inherentes tanto a asistencia técnica como organizativa.
- Reuniones con comunidades en donde no se había elegido Representante Veredal. Se eligió Representantes en las comunidades de Guacarí y en el Asentamiento Indígena de San Francisco de la Vuelta. De igual manera se aclaró con la comunidad de San José del Trapiche, la situación con el Representante de la vereda.
- Para las capacitaciones, se optó por desarrollar Talleres con la participación del Promotor y el Representante Veredal, fomentando el trabajo y la coordinación en equipo.

En éste trimestre se realizó un taller sobre manejo contable de los planes de crédito que ofrece el Convenio en las diferentes áreas.

En términos generales, la experiencia ha sido positiva al brindar elementos que permitan al Promotor Veredal realizar un mejor seguimiento a los grupos y al al Representante Veredal, estar más informado de la gestión del Convenio en las diferentes áreas de intervención.

- En lo que respecta al trabajo con las Comunidades Indígenas, se desarrolló un Taller Evaluativo con la participación de tres(3) de las cuatro(4) Comunidades Indígenas que habitan en el Río Micay:

Juan Cobo, San Francisco de la Vuelta y Belén de Iguana.

Los puntos desarrollados fueron:

- . Revisión de estrategias del trabajo con las Comunidades Indígenas.
- . Identificación de problemas que los afectan dentro del marco de intervención del Proyecto.

Priorización de problemas y formulación de alternativas de solución.

Entre los principales problemas enunciados y sus alternativas de solución, se mencionan:

- . Apoyo para microrealizaciones en lo que respecta a:
Complemento de obras realizadas y apoyo para la realización de áreas de recreación y puestos de salud.
- . Poca participación en actividades del Convenio; como alternativa de solución se planteó utilizar más los espacios de participación comunitaria generados por el Convenio (reuniones zonales, de río e inter-ríos)
- . Falta definir el proyecto de comercialización de artesanías.
Ante esto las acciones emprendidas fueron:
- . Reunión con grupos indígenas interesados para conocer el proceso y definir organización. Realización de inventario de mujeres artesanas, productos que elaboran y cantidades.

3.3.1.6. Apoyo para microrealizaciones.

- Reuniones comunitarias con veredas solicitantes:
Santa Ana, Brazo El Coco y Resguardo Indígena de San Francisco de la Vuelta.
- Priorización de necesidades y definición de compromisos de las comunidades.
- Seguimiento a la participación de la comunidad en obras aprobadas y en ejecución. Apoyo a la organización de mingas y jornadas de trabajo.

3.3.2. Zona 05 . Zona Media

3.3.2.1. Seguimiento Grupos de hecho.

- Teniendo en cuenta que la actividad productiva predominante en la zona media es la agricultura, las acciones del componente social han estado enmarcadas básicamente como elemento de apoyo en la

- Reestructuración de grupos aspirantes a Refinanciación y en la promoción e información del modelo Agroforestal como alternativa agrícola tanto para créditos nuevos como antiguos.

3.3.2.2. Tiendas Comunitarias.

- Análisis del estado organizativo y financieros de las Tiendas Comunitarias de la zona media, en reuniones con Junta Directiva de Asopomy y demás Tiendas asociadas en el río.
- Con la orientación del jefe de zona, se realizó reunión zonal con Tiendas Comunitarias analizando y evaluando compromisos tanto grupales como ante la Asociación. También se asesoró la Reestructuración interna de la Tienda Comunitaria en Zaragoza.

3.3.2.3. Promoción Comunitaria.

- Reuniones de Representantes Veredales con el Jefe de zona, analizando diferentes aspectos inherentes a la intervención del proyecto y definiendo participación en otras instancias (reunión de río e Inter-rios).

3.3.3. Zona 06 Zona Alta.

3.3.3.1. Tiendas Comunitarias.

- Se realizaron cuatro(4) jornadas de trabajo por período con la participación de representantes de las Tiendas Comunitarias de la zona, con el objetivo de asesorar su funcionamiento social, administrativo y contable.
- Reuniones comunitarias en las veredas de Cacahual y San Isidro, para

analizar funcionamiento de la Tienda y comprometer a la comunidad en general en el apoyo y seguimiento que las actividades de la Tienda demanden.

3.3.3.2. Asociativismo

- En este trimestre, las acciones han estado encaminadas a consolidar la Asociación de Mineros. Con este objetivo se desarrollaron las siguientes actividades:
 - . Promoción permanente del Asociativismo entre los mineros de la zona, con miras a elevar los niveles de información y conocimiento sobre Asociativismo como alternativa organizativa a través de la cual pueden lograrse mayores beneficios a diferentes niveles: Comercialización, Organización, Técnico y financiero.
 - . Taller de Asociativismo. Con la participación del Asesor en Asociativismo, se realizó un Taller con participación de Representantes de las veredas intervenidas con crédito en explotación aurífera, dándose un importante paso para la conformación de la Asociación. Esta actividad generó gran motivación y la expectativa es que a corto plazo, mediante asamblea general, la asociación sea una realidad.

3.3.3.3. Seguimiento grupos de hecho.

3.3.3.3.1. Minería.

- Reuniones con grupos beneficiarios en crédito para analizar funcionamiento interno y cumplimiento de compromisos, especialmente lo que respecta a la mancomunalidad.

3.3.3.3.2. Agricultura.

- Reuniones con grupos aspirantes a refinanciación, con énfasis en la reestructuración de los grupos y en la definición de mecanismos

internos que garanticen el funcionamiento de la mancomunidad.

- Reuniones de promoción e información del nuevo modelo agroforestal con agricultores aspirantes a crédito en la vereda El Sigüf.

3.3.3.4. Microrealizaciones

- Conformación de Comités de Trabajo para la realización de las siguientes obras aprobadas:

- . Comité Pro-Cancha Multiusos en la vereda Santa Cruz del Sigüf.
- . Planeación de actividades con la Asociación de padres de familia para la construcción del restaurante escolar en la Escuela Santa Inés.
- . Reunión comunitaria apoyando la organización de los habitantes de la vereda San Antonio de Gurumendi, en la realización de las gradas de acceso.

3.4. Microrealizaciones

3.4.1. Zona 04 Noanamito

3.4.1.1. Obras realizadas con Participación Comunitaria.

Centro de Acopio de Pesca Punta El Coco

Avance: En estudio la localización de vivienda del Administrador, capacidad de tanques para agua y construcción de muelle.

Tienda Veredal Brazo El Coco.

Avance: Aprobación de perfil y acopio de materiales.

Gradas de Acceso Escuela Brazo El Coco.

Avance: Aprobación de perfil, y ejecución de obra en un 100%.

Gradas de Acceso Vereda Brazo El Coco.

Avance: Aprobación de perfil y acopio de materiales de parte de la comunidad.

Puesto de Salud Brazo El Coco.

Avance: Aprobación de perfil y acopio de materiales.

Escuela San Francisco de la Vuelta(Comunidad Indígena).

Avance: Aprobación de perfil, fundición de zapatas y columnas; acopio de materiales.

Ampliación Puesto de Salud Bocagrande.

Avance: Colocación de pilotes para cimentación, columnas y cubierta en tejalit:

Tienda Líder Noanamito

Avance: Finalización de la obra, colocación de puertas y ventanas, fundición de gradas.

3.4.2. Zona 05 Zaragoza

3.4.2.1. Obras Realizadas con participación Comunitarias

Gradas de Acceso Santa Ana

Avance: Se terminó la fundición de las gradas con concreto reforzado.

Tienda Comunitaria Guayabal

Avance: Se inició la construcción de la Tienda; se fundieron las zapatas y columnas en concreto; se acopió material para la terminación de la obra.

Gradas de Acceso Belén de Iguana

Avance: Se fundió la grada con apoyo de la comunidad en un 100%.

Tanque para Puesto de Salud - Zaragoza

Avance: Se aprobó el perfil y se construyó la base para colocación de dos tanques de 500 litros c/u sobre columnas de concreto.

Tienda Veredal Zaragoza

Avance: Se aprobó perfil de obra.

Gradas de acceso Tienda San Joaquín

Avance: Se aprobó perfil y se construyeron las gradas.

3.4.3. Zona 06 López de Micay

3.4.3.1. Obras realizadas con participación comunitaria

Depósito combustible Mineros del Micay

Avance: Se acopió materiales de parte de la comunidad y del Convenio, se identificó el predio.

Cancha Multiuso Santa Cruz de Sigüi

Avance: Se aprobó el perfil, se acopió material y se inició la obra.

Comedor Infantil - Escuela Santa Inés - López de Micay

Avance: Aprobación de perfil, se contrató la construcción de calados; se fundieron columnas y se acopió materiales para la terminación de la obra.

Gradas de acceso Tienda Comunitaria San Antonio de Gurumendi

Avance : Se aprobó perfil y se construyó en su totalidad la grada.

3.5.1. Zona 04 - Noanamito

Se amplió la cobertura al 80%

3.5.2. Zona de Zaragoza

Se mantiene la cobertura de 53%

3.5.3. Zona 06 López de Micay

Se amplió la cobertura al 65%

RIO SAIJA

RESUMEN DEL TRIMESTRE

- Vinculación del nuevo Técnico Agrícola (I.A.) de la Zona 07; se realizó su inducción.
- Visitas de reconocimiento del área agrícola en la Zona 07.
- Evaluación del estado general de los cultivos de coco.
- Capacitación a los Promotores Veredales en el manejo de la nueva propuesta agroforestal.
- Capacitación a grupos beneficiarios de crédito en construcción, manejo de semilleros, aplicación de insumos.
- Énfasis en la responsabilidad mancomunada a los grupos beneficiarios y a los solicitantes.
- Días de campo en control fitosanitario y mantenimiento de cultivos.
- Atención a la solicitud de desembolsos para créditos agrícolas.
- Seguimiento a los grupos beneficiarios en sus labores de mantenimiento de los cultivos.
- Diligenciamiento de solicitudes de crédito agrícola.
- Seguimiento en el diligenciamiento de la ficha operativa de pesca a beneficiarios y promotores.
- Prácticas de campo con faenas de pesca de altura con cuatro Unidades Económicas de Pesca.
- Análisis de la situación de las UEP. financiadas.

- Evaluación de la planilla operativa en todos los componentes técnicos del Proyecto.
- Capacitación a Promotores en técnicas de cateo, seguridad minera, manejo de equipos y buceo en el dragado del oro.
- Elaboración de un plan para recuperar suelos explotados en minería y lograr su reforestación
- Cubrimiento al 100% de los beneficiarios en asistencia técnica.
- Asistencia a la Cooperativa de Mineros del Río en presentación del oro para la venta y compra-venta de insumos y repuestos para la maquinaria minera.
- Reuniones con beneficiarios mineros para ver la situación de los créditos.
- Elaboración de un ajuste en las labores mineras de la región que permita mayor movimiento de tierras con ahorro de personal en las labores, esto utilizando baldes, poleas y ganchos.
- Capacitación en aspectos del crédito a los grupos solicitantes.
- Reuniones con miembros de las juntas de las asociaciones del río.
- Tramitación de solicitudes de crédito agrícola de las zonas 09 y 10 . Y de un crédito para transporte (Motor).
- Continuación en la construcción de las Microrealizaciones aprobadas (Tiendas Comunitarias, Gradas de Acceso).
- Promoción en las Comunidades sobre la nueva propuesta agroforestal y la responsabilidad mancomunada.
- Visitas periódicas a algunas Tiendas Comunitarias que presentan dificultades de funcionamiento.
- Apoyo a los grupos de artesanía y panadería del río.

- Implementación del sistema simple de cuentas en algunas Tiendas Comunitarias'
- Evaluación de la situación de los grupos mineros.

3. ACTIVIDADES

3.1. ASISTENCIA TECNICA

3.1.1. ASISTENCIA TECNICA AGRICOLA

3.1.1.1. ZONA 07 - PUERTO SAIJA

- En este trimestre se realizó la vinculación del nuevo técnico agrícola de la zona 07; se hizo su capacitación e inducción.
- Visitas de reconocimiento del área agrícola de la zona. Evaluación del estado general de los cultivos de coco.
- Reconocimiento y evaluación del área agrícola financiada con monocultivo de plátano con el fin de condonar y refinanciar los beneficiarios para la nueva propuesta agroforestal.
- Capacitación a Promotores Veredales para el manejo de la nueva Propuesta Agroforestal en cada uno de sus componentes: Requisitos de los solicitantes, diligenciamiento de solicitudes, agronomía del cultivo de borjón y cronograma presupuestal.
- Programación de actividades de cada período conjuntamente con Promotores Veredales.

3.1.1.2. ZONA 08 - BOCA DE PATIA

- Para este trimestre se hizo mayor énfasis en lo que correspondió a capacitación a grupos beneficiarios de crédito en la parte de construcción, manejo de semillero, aplicación de insumos.
En los días de campo se trabaja principalmente en el control fitosanitario, drenajes y mantenimiento de cultivos.
- Con los grupos solicitantes de crédito el trabajo se centró en la demostración de Nuevo Modelo Agroforestal y el conocimiento a la responsabilidad mancomunada; para ello fue muy importante la capacitación que se le hizo a los Promotores Veredales ya que sirvió para hacer un mejor trabajo con estos grupos.
- Referente al control fitosanitario se trabajó en la aplicación de insecticidas para el control del gusano tornillo y la hormiga arriera en el cultivo del plátano.
- En los semilleros de Borojó se hizo control para el trozador (Grillo).
- En lo que correspondió al seguimiento de los cultivos se trabajó en el conteo de racimos de plátano a los grupos beneficiarios, los cuales se encuentran en un 30% de su producción.
- Es importante anotar que en este trimestre se dieron desembolsos a grupos beneficiarios para sus labores culturales y compra de insumos.
- Finalmente se han recibido solicitudes de crédito las cuales se espera se les dé salida en el próximo trimestre.

3.1.1.3. ZONA 09 - SAN BERNARDO

- El trabajo de la parte agrícola en este trimestre se basó

principalmente en la capacitación a grupos solicitantes de crédito en el Nuevo Modelo Agroforestal en todas las veredas de la zona, en donde a parte de los grupos solicitantes también asistieron un número considerable de personas de las diferentes veredas de la zona; en esta capacitación se hizo mucho énfasis en la responsabilidad mancomunada.

- De igual manera con estos grupos se hicieron trabajos de construcción de semilleros de Borojó a través de días de campo.
- En lo que correspondió al seguimiento de los grupos beneficiarios se cumplió en su totalidad con el apoyo de los Promotores Veredales en lo referente a labores culturales y control fitosanitario en los cultivos; para esto se hizo desembolsos a grupos de las diferentes veredas de la zona, para que así pudieran cumplir con sus labores de rosería y apuntalada de colinos.
- En la parte de solicitudes de crédito se recibieron diecisiete solicitudes las cuales ya se aprobaron por el Comité de Crédito, beneficiando a un número de 65 familias.
- Fue muy importante y positiva la capacitación que se les hizo a los Promotores Veredales puesto que con ellos se logró dar un mayor entendimiento en la propuesta agroforestal.
- En lo que correspondió a los beneficiarios de plátano algunos grupos obtuvieron cosechas teniendo rendimientos muy bajos debido al problema fitosanitario que hay en la zona. Se espera que para este trimestre otros grupos empiecen a tener producción. Finalmente se tienen unas pocas solicitudes para darles salida este próximo trimestre.

3.1.1.4. ZONA 10 - SANTA ROSA

- Hasta el momento en la zona 10 se han logrado hacer capacitaciones sobre: días de campo en manejo de insumos, talleres en demostración de cronograma presupuestal, manejo de semilleros de borojó, y responsabilidad mancomunada con Promotores Veredales, beneficiarios y Representantes Veredales.
- En este trimestre se trabajó con la parte socioempresarial y la parte social de la zona en capacitación de Promotores Veredales y solicitantes de crédito en el nuevo Modelo Agroforestal.
- De acuerdo con los talleres realizados sobre la propuesta Agroforestal se ha logrado una buena aceptación en esta zona.
- Control fitosanitario: el ataque de plagas y enfermedad en esta zona se ha aumentado de un 15% a 20% en los cultivos en producción, sobre lo cual se está trabajando permanentemente con Promotores Veredales y beneficiarios.
- Asistencia técnica: los seguimientos a los grupos beneficiarios de crédito se han logrado cubrir al 100% en unión con los Promotores Veredales de la zona.
En el momento se encuentran las fincas en producción en un 40% en general.
- En relación a solicitudes de crédito, se encuentran varias de grupos de diferentes veredas, las cuales se están diligenciando.

3.1.2. PESCA - 2


3.1.2.1. ZONA 07 - PUERTO SAJJA

Durante el transcurso de este trimestre se ha trabajado en compañía de los Promotores Veredales aspectos de organización y asistencia técnica, así:

- **Organización:** Se ha intentado consolidar la conformación legal de la Asociación de Pescadores del río Saija; se han presentado contratiempos tales como, desprogramaciones y falta de tiempo de algunos miembros de la junta directiva y lo más grave en estos momentos es la enemistad entre las poblaciones de Los Brazos (sitio de mayor concentración de pescadores) y Puerto Saija. Las relaciones se polarizan, reflejándose esto en el trabajo comunitario en apoyo al Centro de Acopio.
- **Asistencia técnica:** Se llevaron tareas a nivel individual y colectivas para el mejoramiento de los trabajos ya establecidos. La ficha operativa inicialmente se trató de simplificar para lograr en los pescadores la costumbre de consignar datos de interés general; una vez realizados dos talleres sobre cómo diligenciarla y con el seguimiento hecho por los Promotores Veredales a algunas Unidades Económicas de Pescadores, estas la llevaron en una forma más completa.
- Se salió a prácticas de pesca de altura con cuatro Unidades Económicas de Pesca, lo que demostró la falta de experiencia en este tipo de trabajo por parte de los pescadores; se hizo una evaluación de la faena con participación de todos, se describieron los correctivos y se planeó salir de nuevo una vez hechos los ajustes.
- Estado actual de las UEP: de las 24 Unidades Económicas de Pesca beneficiadas con crédito, al 25% de ellas le han sido retirados los equipos de pesca encontrándose estos en regulares condiciones

é incompletos.

Del 75% de UEP restantes el 21% se encuentra incompleto, el 25% con problemas internos y en ambos casos con alta morosidad; el 29% de las UEP está trabajando regularmente con bajos índices productivos debido a que no se siguen indicaciones impartidas.

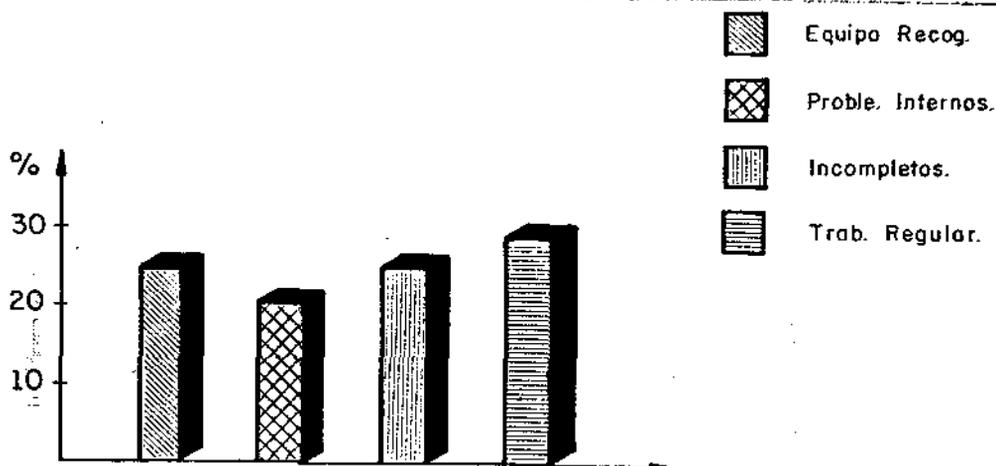

- Evaluación de la planilla operativa: De las nueve metas propuestas inicialmente, el 33% no se llevaron a cabo por la ambición misma del propósito motivado este por la falta de experiencia. El 67% restante de las metas aunque no se culminaron en su totalidad, si están muy próximas a su realización; de aquí que la programación para el trimestre siguiente es más modesta en el número de metas a lograr.

3.1.3. MINERIA

3.1.3.1. ZONA 08 - BOCA DE PATIA y 09 SAN BERNARDO

- **Capacitación:** Durante este trimestre se ha dado capacitación a cinco

- Promotores Veredales de las zonas 08 y 09 así:

ZONA #	# PROMOTORES	CAPACITACION
08	3	Técnicas de cateo Seguridad Minera Manejo de equipos
09	2	Buceo en el dragado de oro Manejo de equipos.

- En el momento está listo para funcionar un plan para rellenar las cavidades dejadas en los trabajos de minería y se tratará de reforestar con árboles maderables. Es un esfuerzo de los Promotores Veredales y los mineros, para tratar de mejorar los suelos dejados en la explotación.

- En el transcurso del trimestre fue necesario el diseño y ejecución de transporte de material por medio de poleas, cables, baldes y ganchos que agilizan y disminuyen el equipo humano de trabajo. También se ejecutó un arranque hidráulico que disminuye el peligro de derrumbes en los frentes que llevan las minidragas, cuando las concentraciones aumentan hacia tierra; este método consiste en convertir las minidragas en un monitor mediante la adaptación de una boquilla, que con chorros de agua tumba la tierra.

- **Asistencia técnica** : El cubrimiento del 100% de los grupos beneficiarios en este trimestre, dejó ver la necesidad de repuestos a cambiar por desgaste normal y mal uso de los equipos.

- Pensando en esto la Cooperativa de Mineros está tratando de cubrir los requerimientos de los mineros, por intermedio de un crédito para comercialización otorgado a la Cooperativa.

- A los grupos solicitantes de crédito se les mostró el manejo técnico de los equipos que solicitan, con visitas a los grupos beneficiados que tienen el mismo esquema de trabajo.
- Se ha dado asistencia a la Cooperativa de Mineros en la presentación del oro en la venta y en la compra-venta de insumos y repuestos para maquinaria minera.
- **Crédito** : Después de analizada la situación técnico-económica de cada uno de los grupos beneficiados, en reuniones conjuntas con solicitantes, se definieron problemas que han causado traumatismo en el buen desarrollo de los créditos y así poder elegir alternativas de solución que mejoren o reduzcan los efectos de estos problemas que son desde la baja producción hasta los malos entendidos entre los socios.
- En el momento se tramitan tres nuevas solicitudes de créditos con los que se trabajó en el manejo de los equipos solicitados.

3.1.3.2. ZONA 10 - SANTA ROSA

- En el transcurso del trimestre se capacitaron cinco Promotores Veredales en técnicas de cateo y seguridad minera.
- Se capacitó a los grupos solicitantes de crédito sobre el manejo técnico de equipos solicitados, con visitas a los grupos beneficiados que tienen el mismo equipo de trabajo.
- Durante el trimestre se diseñó un esquema sobre relleno de cavidades dejadas por las explotaciones mineras de terrazas aluviales; después del relleno se procederá a reforestarlo con árboles maderables y/o plantas leguminosas. Este esquema está listo para ejecutarlo en el próximo trimestre.

- .Se realizó un taller con Promotores Veredales sobre créditos de minería, el cual no tuvo un éxito total por falta de interés de algunos Promotores que no asistieron.
- Se realizó un taller sobre responsabilidad mancomunada con Promotores Veredales y beneficiarios de crédito, además con nuevos solicitantes de crédito minero.
 - A mediados del trimestre fue necesario un ajuste a las labores mineras de la región, el cual consistió en un diseño y ejecución de dos esquemas de laboreo minero así:
 - . El primero consiste en un transporte de materiales que va desde el frente de explotación hasta el almacenamiento de estériles; esta conformado por cables, poleas, baldes y ganchos.
 - . El segundo, es un esquema de arranque hidráulico, el cual consiste en arrancar el material aurífero con un motor ensamblado en uno de los motores de la draga, con el objetivo de evitar accidentes y mover un mayor volumen de tierra.
 - **Asistencia técnica** : A través del trimestre se hicieron visitas de asistencia a todos los grupos beneficiados y a particulares que lo solicitaron. Esta asistencia consistió en técnicas de cateo, métodos de explotación, seguridad minera, preparación de canalones para lavados, manejo de equipos y otros.

3.2. ASISTENCIA CREDITICIA

3.2.1. AGRICULTURA

- Se realizaron actividades de capacitación e información con los grupos

solicitantes de crédito de las zonas media y altas del río Saija (Boca de Patia- Santa Rosa y San Bernardo).

- . En la zona 08 se trabajó con grupos solicitantes de la vereda La Viuda. En la zona 09 se trabajó con grupos de las veredas La Brea, Cabecital, Boca de Güangüí, San Bernardo y San Miguel de Infí. En la zona 10 con grupos solicitantes de las veredas de Santa Rosa, Peté y Boca de Yantín.
- . Los trabajos realizados comprendían la información de los beneficiarios de todo el programa del crédito: aspectos técnicos, determinación de ingresos, determinación de costos, forma de desembolso (plan), plan de pago, determinación de cuotas a pagar y explicación detallada del compromiso que van a asumir (capacitación extensiva a Promotores Veredales).
- . Las anteriores capacitaciones hicieron que se tramitaran diecisiete (17) solicitudes de crédito de la zona 09, que efectivamente se aprobaron por un valor de \$44'891.000.

De la zona 10 (Santa Rosa) se tramitaron siete (7) solicitudes de crédito que fueron enviadas al Comité de Crédito; se está en espera de su aprobación.

3.2.2. PESCA

- Se adelantaron trabajos con los grupos beneficiarios de crédito de pesca. Igualmente no se trabajaron nuevas solicitudes de crédito para este sector.

3.2.3. MINERIA

- Se estan trabajando nuevas solicitudes de crédito en este campo; hay

pendientes de análisis de rentabilidad dos solicitudes correspondientes a la zona 09. En manos del Comité de Crédito hay una solicitud pendiente de aprobación .

- Se hicieron trabajos con el técnico minero de la zona 10 (Santa Rosa) que implicaron visitas a los frentes mineros y tratamiento de las cuentas (estados de cuenta) de cada uno de los grupos. Se establecieron los datos de morosidad y se conversó con los grupos beneficiarios en busca de explicación del porqué de la morosidad.
- Se está en la elaboración de un papelógrafo donde se detalle todo el análisis de rentabilidad que se elabora en los créditos para ponerlos en conocimiento de los Promotores Veredales y de los beneficiarios (capacitación en materia de crédito).
- Con respecto a la Asociación de Mineros, se realizó un primer taller de organización, administración y control de empresas asociativas; fueron participantes los miembros de la Asociación minera.

3.2.4. COMERCIALIZACION

ASOCIACION DE COCOTEROS "ASOCOCOS"

- Se realizó la sexta asamblea general de asociados de Asococos y se trató la problemática de la asociación, el estado del crédito y se dió un informe de las actividades de comercialización realizadas.
- Se recalcó la necesidad de que se aumente la capacitación a sus miembros en aspectos de administración y control de la asociación para poder mejorar la marcha del grupo asociativo.
- No fue posible en el período realizar actividades de capacitación dado el incumplimiento de los citados a las reuniones.

ASOCIACION DE TIENDAS

- Se continuó el proceso de revisión del Proyecto de estatutos para tratar de consolidar y realizar la asamblea de constitución. Esta revisión de estatutos ha contado con una serie de dificultades que se están solucionando en la fecha.
- La comercialización de Bienes Básicos ha continuado su proceso. Se sigue comprando a proveedores de Buenaventura. Se hizo contactos con proveedores de la ciudad de Cali donde muy posiblemente se comercializará posteriormente, dadas las ventajas en precios. Se continuó con la capacitación contable logrando la instalación del Sistema Simple de Cuentas en la Tienda Comunitaria de Santa Rosa.

ASOCIACION DE CARPINTEROS

- Se realizaron reuniones con el grupo de carpinteros quienes han logrado atraer cinco (5) personas más, para reformar el grupo.
- En el momento, se está trabajando en la forma de operar internamente, en los aspectos administrativos y de producción. Así mismo se está en la elaboración de los terminos de la refinanciación a solicitar.
- Igualmente, el equipo solicitó mayor asesoría y capacitación de parte del Convenio. Se realizó un taller donde se mostró el estado del crédito en la actualidad y los lineamientos que exige el Convenio para poder refinanciar al grupo.

OTROS PROYECTOS

- Se tramitó un crédito para transporte que beneficia a la Tienda Comunitaria de Peté; el monto del crédito fué de \$1'400.608.00. Con este servicio se van a beneficiar las Tiendas Comunitarias de la zona 10.

3. **MICROREALIZACIONES**

3.1.1. **OBRAS CON PARTICIPACION COMUNITARIA**

3.3.1.1. **ZONA 07 - PUERTO SAIJA**

- Centro de Acopio de Pesca: Existe un 85% en la infraestructura correspondiente a las áreas de congelamiento, máquinas, zona de trabajo para lavado y pesaje, administración y bodega. Es necesario elaborar un presupuesto adicional para satisfacer las nuevas estrategias de acopio y comercialización y definir claramente la demanda de espacios y consumo de agua de acuerdo a los volúmenes de captura para evitar un desperdicio de recursos económicos.
- Cancha Multiusos: Se terminó la demarcación y fundición de la cancha de baloncesto y voleibol; además se entregaron balones para estimular las actividades deportivas y recreativas.

3.3.1.2. **TIENDAS COMUNITARIAS RIO SAIJA**

- Se terminó la construcción y se hace el recibo de la remesa en los locales de las Tiendas Comunitarias en las veredas de Pisare, La Marciana, La Sierpe, Angostura, Camarones, Calle de Santa Rosa y Cupí, habiendo ejecutado el 75% de las Tiendas pertenecientes a la Asociación.
- Se hizo el acopio de los materiales y está pendiente la terminación de la estructura de cubierta, pisos y paredes en madera de las Tiendas Comunitarias de Santa Bárbara, Santa Rosa, San Agustín y La Viuda.
- Está pendiente la iniciación de la Tienda Comunitaria de Boca de Güangüí, ya que la comunidad prefiere trabajar en la Escuela según lo manifestado en las reuniones con la Promotora Social.

3.3.1.3. ASOCIACION DE MINEROS

- Se definió el terreno y se comenzó el acopio y construcción del local para el depósito de combustible, y repuestos para la Tienda de la Asociación de Mineros en Boca de Patía.

3.3.1.4. GRADAS DE ACCESO

- Se hizo el acopio de materiales para iniciar la construcción de las gradas de las veredas de Angostura y La Brea. En el caso de La Troja se hizo en la vereda de La Marciana debido a que la construcción de la nueva escuela se hizo en ésta última vereda.

3.3.1.5. ESCUELAS

- En el río Saija el Ministerio de Educación asignó recursos entre 4 y 6 millones de pesos en material de cemento cada una para la construcción de las Escuelas de las veredas Los Brazos, La Troja, Cupí, Calle de Jesús, La Brea y San Agustín.
- De acuerdo con lo anterior se hizo la solicitud para la aprobación de los presupuestos de los perfiles para la reparación y terminación de las Escuelas de Boca de Güangüf, Boca de Peté y San Miguel de Infi cuyas instalaciones están en muy mal estado y la comunidad está de acuerdo en el aporte de la mano de obra necesaria para terminarla y/o repararla.

3.4. PROMOCION COMUNITARIA - ZONAS 07 - PUERTO SAIJA Y 08 BOCA DE PATIA.

- Pesca: Se brindó capacitación conjunta con el técnico pesquero sobre el manejo de la ficha operativa de pesca a todas las UEP de la zona.

- También se continuó con el seguimiento que los Promotores Veredales están haciendo sobre el manejo de la ficha pesquera; esto ha aumentado el porcentaje de beneficiarios que manejan el registro.
- Asociativismo: En este aspecto el trabajo de organización no ha podido continuar debido al conflicto existente entre las comunidades de Puerto Saija y Los Brazos.
- . En estas veredas se encuentra el 80% de los afiliados a la Asociación y la Junta Directiva de la misma está integrada por socios de las dos veredas.
- . El conflicto entre estas comunidades obedece a enemistades y factores que son externos a la intervención del Proyecto. Por ello no es conveniente mediar entre las partes; es necesario dar un tiempo de espera a que la situación mejore para poder reiniciar las asambleas y las reuniones de la Junta.
- . En la parte de legalización sólo falta la asamblea de constitución donde se apruebe el Proyecto de estatutos que ya ha sido elaborado y estudiado por parte de los asociados.
- Agricultura: En la zona media se ha hecho promoción del crédito en la nueva propuesta agroforestal y se explicó el manejo de la responsabilidad mancomunada a 20 grupos solicitantes de las veredas de Cupí, La Viuda y La Marciana.
- En la zona 07 se realizaron reuniones con los Promotores Veredales sobre el manejo del crédito y sobre la evaluación del estado actual de los grupos beneficiarios.
- Asociativismo: La Asociación de Cocoteros del Saija está presentando problemas de organización, sobre lo cual se hizo evaluación con la Junta Directiva; también se elaboró un plan de acción que incluye la realización de una Asamblea General extraordinaria para definir la situación de los asociados inactivos y reestructurar la Junta.

- **Minería** : Se hizo la evaluación del estado actual de los grupos beneficiarios de crédito acerca de las razones por las cuales no están respondiendo a los pagos. Se encontró que la mayoría de los grupos de la zona media registran baja producción o tienen problemas técnicos en los equipos. También hay dificultades en la organización de algunos grupos.

La evaluación elaborada fue enviada a Solidarios.

- **Asociativismo**: En BOCA DE PATIA y las zonas altas se sigue en la promoción de la afiliación a la Cooperativa de Mineros del Saija.

Después de recibir el crédito para comercialización la Cooperativa amplió sus servicios en compra de oro y venta de insumos para la producción .

Se les ofreció a los asociados un taller sobre organización y administración cooperativa.

- **Tiendas Comunitarias** : Visitas periódicas a algunas Tiendas que presentan dificultades en su funcionamiento. El cubrimiento de todas las Tiendas de las zonas 07 y 08 es imposible, por lo cual la Junta Directiva de ATICOMSA esta programado visitas periódicas, rotando responsabilidad entre sus miembros .

La Junta Directiva se reúne cada mes para evaluar y programar actividades. Para su legalización ATICOMSA tiene pendiente Asamblea de Constitución.

- **Artesanías**: Panadería

De los tres grupos de panaderas de las zonas 07 y 08 hay uno que no está en funcionamiento por problemas personales de dos de las socias. Hay dos panaderas que entrarán a reemplazar a las que se retiraron.

Por otra parte se está en espera de la capacitación que se solicitó a un grupo de panaderas de Guapi. Los grupos que están funcionando no presentan morosidad y no hay dificultades de organización.

- **Artesanía Indígena** : Las artesanas indígenas de las comunidades de La Sierpe y Calle de Santa Rosa están organizandose de nuevo para volver a integrarse al proyecto de comercialización de artesanías. Estos grupos se habían desvinculado del programa a raíz de las dificultades que se presentaron el año pasado con la salida de los grupos a la Feria Artesanal de Cali.
- **Microrealizaciones**: Se ha hecho promoción para la construcción de las Tiendas Comunitarias de Calle de Santa Rosa, Santa Barbara, Cupí y La Viuda.
- En Boca de Patia se organizaron grupos de trabajo para la construcción del local de la Cooperativa de Mineros del Saija.
- También se hizo un listado de posibles microrealizaciones para el año 1992.

PROMOCION COMUNITARIA - ZONAS 09 y 10

- **Organización Comunitaria**: Para este trimestre se propuso orientar la participación efectiva de cada vereda, a través de un Representante Veredal que verdaderamente lograra desempeñarse como líder y puente entre la entidad y su comunidad. El propósito: sostener continuidad entre Representantes Veredales más efectivos y comprometidos en el cumplimiento de sus funciones. Para lograrlo se propusieron los ajustes con nombramientos y cambios que conjuntamente (comunidad- funcionarios) se consideran necesarios.
- **En la zona 09**: A través de 2 reuniones comunitarias se eligió Representante Veredal y suplente , con el criterio de apoyarse mutuamente y sostener la presencia en los espacios que se requieran.
- **En Cabecital**: la comunidad destituyó al Promotor Veredal por malos manejos de dinero y se nombró en su lugar al que venía desempeñándose

como Representante Veredal.

- **En Boca de Güangüí**: se eligió Representante Veredal. El anterior se fue a permanecer unos meses al interior del país y la comunidad no contaba con representación ante el Convenio.
En lo demás se sostuvo la representación de los mismos líderes para las comunidades de: Güagüí, San Miguel, San Isidro, La Brea, La Mina.
- **En la zona 10**: Se hizo elección de 2 Representantes Veredales para Santa Rosa, principal y suplente. En esta comunidad permaneció como Representante Veredal el rector del colegio. Su situación de permanecer en la población sólo durante los días hábiles de trabajo, sostuvo a la comunidad al margen de beneficios y motivaciones para impulsar alternativas de trabajo con el recurso mutuo: entidad y beneficiarios.
- **En Soledad de Yantín**: también se eligió Representante Veredal; el anterior fue nombrado como Promotor Veredal desde el pasado trimestre. Durante este trimestre se desarrolló un encuentro por período con cada Grupo de Representantes Veredales, integrando capacitación (sobre aspectos de planificación y seguimiento), se realizaron 2 evaluaciones sobre lo que acontecía en cada vereda, alrededor de la incidencia ó impacto del Proyecto en sus diversos componentes.
- La meta a mediano plazo (6 meses, a partir de octubre): Que los Representantes Veredales estén en capacidad de participar con el equipo del río, en la elaboración de la "Planilla Operativa" y en las evaluaciones periódicas y trimestrales de la misma.
- **Comercialización**: En beneficio de ambas zonas (09 y 10), se continuó con el acompañamiento a la Asociación de Tiendas Comunitarias del río: reuniones, informaciones escritas, apoyo en transporte, encuentros evaluativos con las Tiendas que atraviesan situaciones difíciles, etc.
- En la zona 09: Cabecital continúa buscando alternativas para superar-

su quiebra económica debido a mucho fiado, salida de socios con repartición de dineros, dificultades en las relaciones entre varios miembros de la comunidad que a su vez integraban la Tienda Comunitaria. Se acuerdan tareas con responsabilidades definidas y no siempre se cumplen. Los nuevos socios siguen sosteniendo que no son beneficiosos los precios de la remesa que llega a través de la Asociación.

- . Aguaclarita sigue participando intermitentemente en el proceso, su decisión frente a lo favorable del funcionamiento actual en el desempeño de la Asociación, es variable: a veces sí se reconoce, en otros aprovisionamientos de remesa no se distingue favorable.

No se ha podido cubrir particularmente cada Tienda con el aprendizaje y puesta en práctica del Sistema Simple de Cuentas. Se han hecho dos talleres con representación de un asociado por Tienda, pero esto no resulta suficiente; es necesario individualizar y hacer seguimiento sobre la marcha.

- En la Zona 10: La nueva Tienda Comunitaria de Peté se sostiene favorablemente; se les colabora en el diligenciamiento de la solicitud de crédito para motor fuera de borda con la condición de apoyar a la red de Tiendas de la zona 10.

- La Tienda de Santa Rosa sostiene su servicio; se logra que la vendedora lleve el Sistema Simple de Cuentas y se le hace seguimiento. Es importante recordar que el fortalecimiento de la organización de Tiendas Comunitarias, brinda una alternativa ya considerada para la comercialización de doble-vía: así habría posibilidad para los agricultores de acuerdo a sus tiempos y cantidades de producción. Esto se estaría definiendo de mejor manera en la propuesta agrícola, complementada con los aspectos socio-económicos que se procura dejar escrita en el río, al cierre del año 91, con la participación del equipo interdisciplinario en las respectivas áreas.

Asistencia Técnica.: En ambas zonas (09 y 10) se dedicó bastante tiempo a explicar con los diferentes grupos solicitantes de crédito, la propuesta agrícola para el cultivo agroforestal. El objetivo era recoger firmas después de la comprensión por parte de los grupos del proyecto en el que entraban a comprometerse.

- En lo demás se respondió a los llamados que se hicieron frente a necesidades con grupos de minería. Así mismo hubo dos talleres por zona, con Promotores Veredales sobre manejo y seguimiento de crédito en minería y agricultura.
- En la zona 09 se brindó asistencia técnica de manera especial a los dos grupos de artesanías (Aguaclarita y San Miguel).

Este proyecto evoluciona, con diversos inconvenientes frente a los que se buscan alternativas sobre la base de una decisión de las comunidades; por ahora no se comprometen con crédito para esta área de producción.

- Seguimiento a los dos grupos de panadería a partir de los registros de producción, gastos, ventas; estos grupos se han empantanado para crecer o fortalecerse, desde su necesidad de ofrecer variedad en la producción; es una capacitación pendiente que se espera tener para el último trimestre con panaderas de Guapí.
- **Crédito** : Con los técnicos (minería y agricultura) se han adelantado entrevistas, reuniones comunitarias y con grupos solicitantes, explicándoles el tipo de proyecto que se apoya. Esto ha podido ser más claro en el caso de agricultura; para la minería continúan las dudas a nivel de: cantidades de producción por período de tiempo, días de trabajo promedio/mes, tipo de equipos más adecuados a la producción del río, alternativas de mantenimiento técnico para la maquinaria en el mismo río, posibilidades de capacitación a representantes de algunos grupos beneficiarios en aspectos concernientes a la mecánica, etc.

4. INFORME DEL FONDO DE CREDITO

4.1. RESUMEN DEL TRIMESTRE

El comportamiento en la aprobación de créditos en el segundo y tercer trimestre de 1.991, el de mayor cobertura fue la agricultura que representa el 76%, y la minería con el 19% (cuadro No 6).

En los desembolsos igualmente tienen la misma tendencia que en la aprobación.

Los reembolsos el río que más recupero fué el Naya con un 36%, luego el Micay con 35% y Saija el 29%.

La cartera vencida durante este período segundo y tercer trimestre, la mayor se presentó en el río Micay 42%, Naya 35% y Saija 23%.

4.2. CREDITOS APROBADOS, DESEMBOLSOS, REEMBOLSOS Y CARTERA VENCIDA.

A continuación analizamos algunas cifras correspondientes a créditos aprobados, desembolsos, reembolsos y cartera vencida.

4.2.1. CREDITOS APROBADOS

Entre el primer y tercer trimestre de 1.991, se observa un incremento en el río Naya del 11%, Micay 16% y Saija 21% (cuadro N° 3). La aprobación de crédito para los tres ríos fué de \$798'286.000., que representan un 16% en comparación al primer trimestre, de los cuales se ha desembolsado el 83% o sea \$658'646.000.

En cuanto a colocación de recursos el mayor fue para el sector agrícola que presenta el 52% del total (cuadro 4-5-).

4.2.2. **DESEMBOLSOS**

Se incrementó entre el primer y tercer trimestre así: Río Naya 14%, Micay 10% y Saijá 6% (cuadro No. 8).

Los desembolsos acumulados a septiembre 30 de 1.991 asciende a \$658'646.000 de pesos, se entregaron entre el segundo y tercer trimestre \$59'249.000 que corresponden al 9% del total acumulado.

La actividad más representativa fue la agricultura con 43%, luego la pesca con 29% y minería con 5% (cuadro N° 9).

4.2.3. **REEMBOLSOS**

En el segundo y tercer trimestre fueron de \$7'533.000 recuperados, destacándose el río Naya con 35% del total, para un acumulado a septiembre 30 de 1.991 de todos los ríos de \$50'960.000 siendo la minería \$16'579.000 o sea el 33%, comparado con el primer trimestre de \$43'427.000 (cuadro N° 11 - 12).

4.2.4. **CARTERA VENCIDA**

La cartera vencida acumulada se incrementó de \$114'616.000 en el primer trimestre a \$278'365.000 en septiembre 30 de 1.991 (un 41%) y en el segundo y tercer trimestre fue de \$163'749.000. Comparando

la vencida de \$278'365.000 contra el total créditos aprobados (\$798'286.000) equivale a un 35% (cuadro N° 16).

De acuerdo al cuadro N° 16 las cifras más relevantes de vencimiento de los créditos son:

Pesca 54%, Otras (motosierra, transporte) el 53%, Minería 45%, Artesanías 34% y comercialización 11% (cuadro N° 16).

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO N° 1

CREDITOS APROBADOS ACUMULADOS A JUNIO 30 DE 1.991 (MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD/RIO	NAYA	PORCENTAJE	MICAY	PORCENTAJE	SAIJA	PORCENTAJE	TOTALES	PORCENTAJE
Agricultura	89.439	41	151.483	58	107.575	47	348.497	49
Pesca	79.100	36	55.612	21	54.455	24	189.167	27
Minerfa	17.618	8	33.790	13	33.943	14	85.351	12
Comercialización	18.029	8	9.438	4	12.714	6	40.181	6
Artesanías	6.079	3	-	0	10.722	5	16.801	2
Otras	9.053	4	9.435	4	9.058	4	27.546	4
Totales	219.318	100.0	259.758	100.0	228.467	100.0	707.543	100.0
	31%		37%		32%		100%	

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO N° 2

CREDITOS APROBADOS ACUMULADOS SEPTIEMBRE 30 DE 1.991 (MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD/RIO	NAYA	PORCENTAJE	MICAY	PORCENTAJE	SAIJA	PORCENTAJE	TOTALES	PORCENTAJE
Agricultura	101.416	42	164.485	58	150.946	55	416.847	52
Pesca	79.612	33	55.612	20	54.455	20	189.679	24
Minería	26.468	11	45.420	16	33.943	12	105.831	13
Comercialización	18.029	7	9.438	3	12.714	5	40.181	5
Artesanías	6.079	3	-	0	10.722	4	16.801	2
Otras	9.053	4	9.435	3	10.459	4	28.947	4
Totales	240.657	100%	284.390	100%	273.239	100%	798.286	100%
	30%		36%		34%		100%	

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO Nº 3

RESUMEN COMPARATIVO CREDITOS APROBADOS ACUMULADOS ENTRE MARZO Y SEPTIEMBRE DE 1.991
(MILES DE PESOS)

Actividad	RIO NAYA			RIO MICAY			RIO SAJA		
	Acumulado marzo 31/91	Aprobado abril a sep.30/91	Acumulado sept.30/91	Acumulado mar. 31/91	Aprobado de abril a sep/91	Acumulado a sept 30/91	Acumulado mar. 31/91	Aprobado de abril a sep/91	Acumulado a sep 30/91
Agricultura	88.233	13.183	101.416	136.408	28.077	164.485	107.575	43.371	150.946
Pesca	79.100	512	79.612	55.612	- 0 -	55.612	54.651	(196)	54.455
Minería	17.468	9.000	26.468	33.762	11.658	45.420	33.943	- 0 -	33.943
Comercialización	17.323	706	18.029	9.438	- 0 -	9.438	9.964	2.750	12.714
Artesanías	6.079	- 0 -	6.079	- 0 -	- 0 -	- 0 -	10.722	- 0 -	10.722
Otras	8.983	70	9.053	9.435	- 0 -	9.435	9.058	1.401	10.459
Totales	217.186	23.471	240.657	244.655	39.735	284.390	225.913	47.326	273.239

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO N° 4

RESUMEN COMPARATIVO CREDITOS APROBADOS ACUMULADOS

RIOS NAYA, MICAY Y SAJA A SEPTIEMBRE 30 DE 1.991

(MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD	ACUMULADO A MARZO 31/91	APROBADO DE ABRIL A SEPT 1.991	ACUMULADO A SEPT. 30/91
Agricultura	332.216	84.631	416.847
Pesca	189.363	316	189.679
Minería	85.173	20.658	105.831
Comercialización	36.725	3.456	40.181
Artesanías	16.801	- 0 -	16.801
Otras	27.476	1.471	28.947
Totales	687.754	110.532	798.286

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO N° 5

**RESUMEN COMPARATIVO DE CREDITOS APROBADOS
Y DESEMBOLSOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 1.991
(MILES DE PESOS)**

RIOS	CREDITOS APROBADOS	DESEMBOLSOS	PENDIENTE DESEMBOLSO
Naya	240.657	203.329	37.328
Micay	284.390	237.899	46.491
Saija	273.239	217.418	55.821
Totales	798.286	658.646	139.640

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO N° 6

DESEMBOLOS ACUMULADOS A JUNIO 30 DE 1.991

(MILES DE PESOS)

Actividades	Río Naya	Río Micay	Río Saija	Total	%
Agricultura	63.813	102.155	90.968	256.936	42
Pesca	79.100	58.217	52.776	190.093	31
Minería	14.221	36.544	26.469	77.234	13
Comercialización	10.480	9.438	10.868	30.786	5
Artesanías	5.635	- 0 -	10.721	16.356	3
Otras	9.053	9.436	18.694	37.183	6
Total	182.302	215.790	210.496	608.588	100
%	30	35	35	100	

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO Nº 7

DESEMBOLSOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 1.991

(MILES DE PESOS)

Actividades	Río Naya	Río Micay	Río Saija	Total	%
Agricultura	77.300	112.634	94.945	284.879	43
Pesca	80.695	58.217	52.776	191.688	29
Minería	19.524	48.174	29.414	97.112	15
Comercialización	11.122	9.438	10.868	31.428	5
Artesanías	5.635	- 0 -	10.721	16.356	2
Otras	9.053	9.436	18.694	37.183	6
Total	203.329	237.899	217.418	658.646	100
%	31	36	33	100	

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO N° 8

RESUMEN COMPARATIVO DESEMBOLSOS ACUMULADOS

ENTRE MARZO Y SEPTIEMBRE DE 1.991

(MILES DE PESOS)

Actividad	RIO NAYA			RIO MICAY			RIO SAIJA		
	Acumulado a mar 31/91	Desembolsos de abril a sep /91	Acumulado a sep 30/91	Acumulado a mar 31/91	Desembolsos de abril a sep/91	Acumulados a sep 30/91	Acumulado a mar 31/91	Desembolsos de abril a sep/91	Acumulado a sep 30/91
Agricultura	59.750	17.550	77.300	102.155	10.479	112.634	87.118	7.827	94.945
Pesca	79.100	1.595	80.695	58.217	- 0 -	58.217	52.217	559	52.776
Minería	13.915	5.609	19.524	36.369	11.805	48.174	26.359	3.055	29.414
Comercialización	10.480	642	11.122	9.438	- 0 -	9.438	10.868	- 0 -	10.868
Artesanías	5.607	28	5.635	- 0 -	- 0 -	- 0 -	10.721	- 0 -	10.721
Otras	8.983	70	9.053	9.436	- 0 -	9.436	18.664	30	18.694
Totales	177.835	25.494	203.329	215.615	22.284	237.899	205.947	11.471	217.418

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO Nº 9

RESUMEN COMPARATIVO DESEMBOLSOS ACUMULADOS

RIOS NAYA, MICAY Y SAIJA ENTRE MARZO Y SEPTIEMBRE DE 1.991

(MILES DE PESOS)

Actividad	Acumulado a marzo 31/91	Desembolsos abril a sep./91	Acumulado a septiembre 30/91
Agricultura	249.023	35.856	284.879
Pesca	189.534	2.154	191.688
Minería	76.643	20.469	97.112
Comercialización	30.786	642	31.428
Artesanías	16.328	28	16.356
Otras	37.083	100	37.183
Totales	599.397	49.249	658.646

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CHE

CUADRO N° 10

REEMBOLSOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 1.991

(MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD	RIO NAYA	RIO MICAY	RIO SAJAJA	TOTAL
Agricultura	374	2.875	1.326	4.575
Pesca	7.811	5.341	2.668	15.820
Minería	677	10.397	5.505	16.579
Comercialización	2.830	2.328	1.366	6.524
Artesanías	1.282	- 0 -	596	1.878
Otras	2.891	733	1.960	5.584
Totales	15.865	21.674	13.421	50.960
Porcentaje (%)	32	41	27	100

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
CONVENIO CVC - CEE
CUADRO Nº 11
RESUMEN COMPARATIVO REEMBOLSOS ACUMULADOS
ENTRE MARZO Y SEPTIEMBRE DE 1.991
(MILES DE PESOS)

Actividad	RIO NAYA		RIO MICAY			RIO SAIJA		
	Acumulado a mar 31/91	Reembolsado de abril a sept/91	Acumulado a mar 31/91	Reembolsado de abril a sept/91	Acumulado a sep 30/91	Acumulado a mar 31/91	Reembolsado de abril a sept/91	Acumulado de abril a Sept/91
Agricultura	374	- 0 -	2.761	114	2.875	703	623	1.326
Pesca	7.484	327	5.314	27	5.341	2.370	298	2.668
Minería	666	11	8.255	2.142	10.397	5.160	345	5.505
Comercialización	1.530	1.300	1.993	335	2.328	1.122	244	1.366
Artesanías	919	363	- 0 -	- 0 -	- 0 -	419	177	596
Otras	2.182	709	698	35	733	1.477	483	1.960
Totales	13.155	2.710	19.021	2.653	21.674	11.251	2.170	13.421

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO N° 12

RESUMEN COMPARATIVO REEMBOLSOS ACUMULADOS

RIOS NAYA, MICAY Y SAIJA ENTRE MARZO Y SEPTIEMBRE DE 1.991

(MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD	ACUMULADO A MARZO 31/91	REEMBOLSADO DE ABRIL A SEPT/91	ACUMULADO A SEPT. 30/91
Agricultura	3.838	737	4.575
Pesca	15.168	652	15.820
Minería	14.081	2.498	16.579
Comercialización	4.645	1.879	6.524
Artesanías	1.338	540	1.878
Otras	4.357	1.227	5.584
Totales	43.427	7.533	50.960

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
CONVENIO CVC - CEE

CUADRO N° 13

CARTERA VENCIDA ACUMULADA A SEPTIEMBRE 30 DE 1.991
(MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD	RIO NAYA	RIO MICAY	RIO SAJA	TOTALES
Agricultura	22.644	54.366	25.877	102.887
Pesca	54.767	37.907	9.864	102.538
Minería	9.453	13.624	24.235	47.312
Comercialización	2.280	556	1.775	4.611
Artesanías	3.857	- 0 -	1.794	5.651
Otras	3.205	7.907	4.254	15.366
Totales	96.206	114.360	67.799	278.365

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO N° 14

RESUMEN COMPARATIVO CARTERA VENCIDA ACUMULADA

ENTRE MARZO Y SEPTIEMBRE DE 1.991

(MILES DE PESOS)

Actividad	RIO NAYA			RIO MICAY			RIO SAJJA		
	Acumulado a mar 31/91	Cartera vencida de marz. a sep/91	Acumulado a sep 30/91	Acumulado a mar 31/91	Cartera vencida de mar. a sep/91	Acumulado a sep 30/91	Acumulado a mar 31/91	Cartera vencida de mar. a sep/91	Acumulado a sep 30/91
Agricultura	1.247	21.397	22.644	13.106	41.260	54.366	3.680	22.197	25.877
Pesca	26.768	27.999	54.767	22.105	15.802	37.907	10.881	(1.017)	9.864
Minería	3.884	5.569	9.453	5.554	8.070	13.624	10.385	13.850	24.235
Comercialización	382	1.898	2.280	- 0 -	556	556	1.616	159	1.775
Artesanías	3.112	745	3.857	- 0 -	- 0 -	- 0 -	1.975	(181)	1.794
Otras	2.792	413	3.205	4.608	3.299	7.907	2.521	1.733	4.254
Totales	38.184	58.021	96.206	45.374	68.987	114.360	31.058	36.741	67.799

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO N° 15

CARTERA VENCIDA ACUMULADA RIOS NAYA, MICAY Y SAJJA

ENTRE MARZO Y SEPTIEMBRE DE 1.991

(MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD	ACUMULADO A MARZO/91	VENCIDA DE ABRIL-SEP/91	ACUMULADO A SEPT. 30/91
Agricultura	18.033	84.854	102.887
Pesca	59.754	42.784	102.538
Minería	19.822	27.490	47.312
Comercialización	1.998	2.613	4.611
Artesanías	5.088	563	5.651
Otras	9.921	5.445	15.366
Totales	114.616	163.749	278.365

PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

CONVENIO CVC - CEE

CUADRO Nº 16

PORCENTAJE VENCIMIENTO ENTRE CREDITOS APROBADOS Y CARTERA VENCIDA

RIOS NAYA, MICAY Y SAJJA A SEPTIEMBRE 30 DE 1.991

(MILES DE PESOS)

ACTIVIDAD	CREDITOS APROBADOS A SEP. 30/91	CARTERA VENCIDA A SEP. 30/91	PORCENTAJE VENCIMIENTO
Agricultura	416.847	102.887	13
Pesca	189.679	102.538	54
Minería	105.831	47.312	45
Comercialización	40.181	4.611	11
Artesanías	16.801	5.651	34
Otras	28.947	15.366	53
Totales	798.286	278.365	35

5. INFORME FINANCIERO

CONVENIO PERUENOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEP / 91

ACTIVOS

EFFECTIVO:		\$32,024,720.82
Caja General	\$0.00	
Bancos	32,024,720.82	
Popular Cali	16,146,415.81	
Popular B/ventura	15,878,305.01	

CUENTAS POR COBRAR:		137,946,538.83
Cajas Menores (Pendiente de desc)	\$4,000,000.00	
Anticipo a Funcionarios	2,492,137.07	
Gastos pagados por Anticipado	7,734,749.00	
Rendimientos Financieros	7,522,330.50	
Otras Cuentas por Cobrar	117,687,852.46	
Menos: Provisión para deudas de dific. cob	(1,489,731.00)	

INVERSIONES:		215,000,000.00
Depósitos a Termin	\$215,000,000.00	
Certificados de Cambio	0.00	

INVENTARIOS:		39,610,899.17
Mater. y suminist. de consumo	\$26,298,605.31	
Pedidos por ingresar al almac.	13,311,493.86	

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:		168,646,648.65
Vehículos y Eq. transporte	\$44,628,491.20	
Eq. y Herramientas Zona	96,164,822.90	
Muebles y Eq. de Oficina	27,853,334.55	

TOTAL ACTIVOS:		\$593,228,006.67


Rodolfo Tamayo N.
Contador

WERNER FEISTKORN
Cod. Europeo

JAMES ORTEGA A.
Cod. Colombiano

RODOLFO TAMAYO N.
Contador

CONVENIO PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEP / 91


PASIVO Y FONDO

PASIVOS

SOBRESIROS BANCARIOS:			\$2.22
Banco Popular Cali		\$0.00	
Banco Popular B/ventura		0.00	

CUENTAS POR PAGAR:			38,854,298.35
Proveedores	\$38,338,448.94		
Gastos Acumulado por pagar	0.00		
Otras Cuentas por Pagar	515,849.41		

TOTAL PASIVOS			\$38,854,298.35
SALDO DEL FONDO			554,373,708.32
TOTAL PASIVO Y FONDO			-----
			\$593,228,006.67



WERNER FEISTKORN
Cod. Europeo

JAMES ORTEGA A.
Cod. Colombiano

RODOLFO TAMAYO N.
Contador

CONVENIO PEDUENOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

ESTADO DE OPERACIONES Y CAMBIO EN EL SALDO DEL FONDO

DE JULIO 1 A SEPT. 30 DE 1991

INGRESOS:

Aportes C.E.E.	\$0.00
Rendimientos Financieros	20,164,857.97
Otros Ingresos	101.16

TOTAL INGRESOS \$20,164,959.13

BASTOS:

Proyecto de Credito	\$13,830,148.00
Infraestructura	30,500,927.13
A.T. Nacional	27,002,654.50
Funcionamiento Ofc. Central	11,672,585.32
Equipamiento	9,379,269.01
Imprevistos	3,831,195.25

TOTAL BASTOS 96,216,779.21

EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS (76,051,820.06)

SALDO DEL FONDO AL 1 DE JULIO DE 1991 630,425,528.40

SALDO DEL FONDO AL 30 DE SEPT. DE 1991 \$554,373,708.32


RODOLFO TAMAYO NIEVA
CONTADOR

CONVENIO PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS
COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ACUMULADO

AL 30 DE SEPT. DE 1991

SALDO INICIAL DEL FONDO AL 1 DE SEPT. / 87. \$100.00

RECURSOS OBTENIDOS DE:

Aportes CEE:	\$2,129,497,088.00
Rendimientos Financieros	174,550,759.00
Otros Ingresos	1,030,535.00
Aumento en Cuentas por Pagar	38,854,298.00
Aumento en Sobregiros Bancarios	0.00

TOTAL RECURSOS OBTENIDOS DE OPERACIONES 2,343,932,700.00

RECURSOS APLICADOS A:


Proyecto de Credito	901,127,437.00
Infraestructura	396,478,632.00
Promoción Comunitaria	11,190,977.00
A.T. Nacional	260,803,651.00
Funcionamiento Ofc. Central	11,672,585.00
Equipamiento	9,379,269.00
Coordinación	11,742,194.00
Imprevistos	186,310,249.00
Aumento de Activos	168,646,649.00
Vehiculos	44,626,491.00
Eq. Herr. Zona	96,184,523.00
Eq. Mueb. Ofc.	27,833,635.00

Aumento en Cuentas por Cobrar	137,946,538.00
Aumento en Inventar. y Ped. por liq.	39,610,099.00
Aumento en Inversiones Temporales	213,200,000.00

TOTAL RECURSOS APLICADOS 2,311,908,060.00

EFFECTIVO AL 30 DE SEPT. DE 1991 \$32,024,720.00

Saldo Banco Popular Cta. anterior	\$2,865,704.00
Saldo Banco Popular Cali Cta. Nueva	13,260,712.00
Saldo Banco Popular B/ventura. Cta. Anter	3,713,344.00
Saldo Banco Popular B/ventura Cta. Nueva	12,164,560.00
Saldo Caja Principal	0.00



RODOLFO TAMAYO NIEVA
CONTADOR

GASTOS ACUMULADOS CON FONDOS DE LA C.F.E.

DE JULIO A DIC. 31 DE 1971

RUBRO	EN PESOS COLOMBIANOS		E N E C U	
	Ejecutado total Mes de sept.	Ejecutado total Julio/Dic.	Ejecutado total Mes de Sept.	Ejecutado total Julio/Dic.
		Disponible 1.971		Disponible 1.971
10. CREDITO	4,647,742	358,100,000	5,891	436,788
12. Gastos de Viaje	267,221	1,200,000	339	1,462
13. Equipos y Repuestos	0	7,000,000	0	8,537
14. Materiales	0	900,000	0	1,078
15. Fondo de Credito	0	300,000,000	0	365,854
16. Asist. Tech. y Credit	3,247,521	38,500,000	4,173	46,751
17. Consultorias	0	1,500,000	0	1,830
18. Contrato Solidarios	1,000,000	6,000,000	1,267	7,318
19. Otros Gastos	88,000	3,000,000	112	3,658
20. INFRAESTRUCTURA	7,534,254	320,000,000	9,546	390,245
21. Mano de Obra	1,403,300	19,500,000	1,395	23,780
23. Equipos y Repuestos	26,339	10,000,000	33	21,951
24. Material. de Constr.	486,715	55,000,000	515	67,074
25. Transp. de Material.	1,007,450	9,500,000	1,277	11,586
26. Funcionamiento	791,000	2,000,000	369	2,440
27. Contratistas	4,075,102	210,000,000	5,114	256,098
29. Otros Gastos	664,368	6,000,000	642	7,316
		344,269,852		419,179
		564,709		881
		7,000,000		0
		900,000		0
		300,000,000		0
		28,552,543		12,602
		1,500,000		0
		3,000,000		3,802
		2,812,500		238
		289,499,873		38,626
		17,529,700		2,497
		15,880,335		2,687
		39,553,627		19,577
		7,201,850		2,913
		1,689,000		495
		204,144,522		7,421
		3,560,439		3,067

GASTOS ACUMULADOS CON FONDOS DE LA C.E.E.

DE JULIO A DICIEMBRE DE 1991

CÓDIGO	CONCEPTO	EN PESOS COLOMBIANOS				EN ECU		
		Ejecutado Mes de sept.	Ejecutado total	Presupuestado Julio/Dic.	Disponible 1991	Ejecutado total	Presupuestado Julio/Dic.	Disponible 1991
30.	EST. NACIONAL	9,621,299	27,002,456	376,000,000	369,897,394	12,195	367,195	322,972
31.	Salarios y N. Extras	4,782,200	12,557,165	306,400,000	295,842,835	6,861	272,439	236,524
32.	Gastos de viaje	1,388,576	4,327,294	10,000,000	5,670,786	1,750	12,195	6,705
33.	Eq. Muebles y Mater.	132,030	3,031,018	12,000,000	8,968,982	167	14,634	18,792
34.	Oficina	962,283	2,000,000	2,000,000	0	1,220	2,440	(94)
35.	Alq. y Servicios	675,260	1,301,082	8,000,000	6,696,913	856	5,756	8,104
36.	Imprenta y Public.	75,000	288,157	9,000,000	8,711,843	95	16,976	10,611
37.	Seguros	1,532,773	2,981,177	4,000,000	1,018,823	1,943	4,878	1,100
38.	Coordinación	0	50,000	30,000,000	37,950,000	0	23,170	23,167
39.	Otros Gastos	73,187	462,758	5,000,000	5,037,242	93	6,707	6,126
40.	EST. NACIONAL	1,051,294	11,672,563	36,400,000	24,727,415	1,333	44,351	29,597
43.	Reparaciones	8,500	134,014	6,000,000	5,865,986	11	7,317	7,117
44.	Mantenimiento	615,336	1,800,000	1,500,000	0	780	2,196	(85)
45.	Materiales de oficina	307,136	2,137,953	2,400,000	2,62,915	389	2,926	217
48.	Alimentación	0	7,033,435	25,000,000	17,964,565	0	30,488	21,574
49.	Otros Gastos	120,320	568,051	1,200,000	651,949	152	1,454	794

GASTOS ACUMULADOS CON FONDOS DE LA C.F.E.

DE JULIO A DIC. 31 DE 1991

RUBRO	EN PESOS COLOMBIANOS				E N E C U			
	Ejecutado Mes de sept.	Ejecutado total	Presupuestado Julio/Dic.	Disponible 1.991	Ejecutado Mes de Sept.	Ejecutado total	Presupuestado Julio/Dic.	Disponible 1.991
50. EQUIPAMIENTO	2,439,045	9,379,269	169,500,000	160,120,731	3,891	11,888	206,707	194,819
51. Vehiculos	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	24,390	24,390
52. Motores F.B.	2,439,045	9,379,269	137,000,000	127,620,731	3,891	11,888	167,073	155,185
53. Embarcaciones	0	0	7,000,000	7,200,000	0	0	8,781	8,781
54. Material Didactico	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	4,634	4,634
59. Otros Gastos	0	0	1,000,000	1,500,000	0	0	1,829	1,829
60. IMPREVISTOS	1,370,900	17,011,368	82,383,000	65,371,632	1,738	21,561	100,468	78,907
69. Imprevistos	1,370,900	17,011,368	82,383,000	65,371,632	1,738	21,561	100,468	78,907
TOTALES	26,664,534	109,396,953	1,363,283,000	1,253,886,047	33,796	138,653	1,533,714	1,397,061

TASA DE CAMBIO APLICADA: \$789.00

[Handwritten Signature]
Amor

RODOLFO TAMAYO NIEVA
CONTADOR

EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO PIDER CEE
RECURSOS PRESUPUESTO NACIONAL 1991

MAR.	1° TRIMESTRE.91			2° TRIMESTRE .91			AGT	SEP	TOTAL 1991					
	\$ COL.	\$ ECUS	\$ COL.	\$ ECUS	\$ COL.	\$ ECUS								
	68,116,589	95,183	7,979,747	5,787,894	5,921,653	19,688,494	38,218	8,987,745	5,758,349	8,874,381	23,628,475	31,427	111,345,558	156,748
	58,945,384	63,663	1,348,834	255,188	182,544	1,786,558	2,913	1,548,888	1,548,888	1,952	54,271,862	68,528		
	48,897,399	68,998	1,319,434	188,888	25,924	286,804	325	1,548,888	1,548,888	1,952	51,756,833	65,111	286,884	325
	1,953,538	2,495	29,400	75,188	156,620	261,120	377				2,214,650	2,872		
	94,375	178					42				94,375	228		
	17,171,285	31,448	6,885,447	5,451,914	5,739,189	17,796,478	27,268	8,987,745	5,758,349	7,334,381	22,888,475	29,475	57,848,230	88,175
			25,466			25,466	45				25,466	45		

25,466 25,466 45 25,466 45

6. LISTADO DE PERSONAL

6. Listado de Personal

6.1 Oficina Central

- Codirector Colombiano	James Ortega A.
- Codirector Europeo	Werner Feistkorn
- Asesor Codirector Colombiano	Jorge Enrique Blandón
- Administrador	Hernán Figueroa
- Asistente Administrativo	Laureano Hernández R.
- Secretaria	Julia Caicedo
- Secretaria	Alexandra Figueroa A.
- Contador	Rodolfo Tamayo
- Asistente Contador	Harold Walles B.
- Auxiliar Contable	Lilia López G.
- Motorista	Hossman Zapata F.
- Mensajero	Hipólito Prado O.
- Aseadora	Martha Lucía Prado O.
- Vigilantes	Jorge Rua
	Jhonny González

6.2. Oficina Puerto Merizalde -Crédito

- Coordinadora Fondo Rotatorio	María Lupe Freire
- Asesor Crédito	Luis Salomón Muñoz
- Análisis de Crédito	José Antonio Acevedo
- Secretaria	Luz Marina Ramírez
- Secretaria	Romelia Sánchez

6.3 Personal Río Naya

6.3.1.Zona 01 - Puerto Merizalde

- Coordinador	Jaime Mañozca R.I.A.
- Subadministrador	Juan G. Martínez CVC
- Asistente Técnico Agrícola (Jefe de zona)	Ildefonso Ocampo I.A
- Asistente Técnico de Pesca	Libardo Caicedo
- Promotora Social	Leila Andrea Arroyo
- Arquitecto	Luis Fernando Henao (todo el Proyecto) PLADEICOP
- Inspector Obra Civil	Jorge Enrique Ríos
- Secretaria	María Moreno E.
- Secretaria	Luz Dary Garcés A.
- Asistente Socio -Empresarial	Tiberio Obando Olaya
- Técnico Agricultura	Fredy Borrero Secr.Agr.
- Almacenista	Hugo Castillo Alberto Osorio (Todo el Proyecto)
- Kardista	Nicolás Asprilla CVC (Todo el Proyecto)
- Ayudante de Almacén	Miguel Bustos CVC (Todo el Proyecto)
-Mecánico	Fulvio Salazar (Todo el Proyecto)
- Ayudante Mecánica	Concepción Nuñez (Todo el Proyecto)
- Motoristas	Pedro A. Meza - CVC Wilfrido Benítez Romelio I. Opua -CVC Ramón Angulo Faustino Mosquera

- Motoristas José Castro Palma
Aniano Castro
Alberto Advíncola
- Aseadora Janeth Caicedo
- Vigilantes Oficina, Almacén
Combustible Luis A. Angulo
Cervelión Panameño
Carlos Zamora
Bartolo Mina
Roberto Sinisterra
- Vigilantes Buenaventura Edgar Mantillo
Hemérito Carabalí
James Vinuesa C.

6.3.2. **Zona 02 - San Francisco**

- Jefe de Zona Evelyn Bautista
- Promotora Social Yency Murillo
- Técnico Agrícola María Consuelo Lasso
- Motorista Patricio Angulo

6.3.3. **Zona 03 - La Concepción**

- Técnica de Minas (Jefe de Zona) Liana Asprilla
- Técnico Agrícola Oliverio Salgado
- Motorista Marcelino Viveros

6.4. **Personal Río Micay**

6.4.1. **Zona 04 - Moanamito**

- Coordinador	Adolfo León Martínez
- Subadministrador	Gabriel Suárez
- Promotora Social	Gloria P. Lerma
- Asistente Técnico Agrícola	Pedro Nel Lobatón
- Asistente Socio Empresarial	Jorge Ivan Valencia
- Asistente Técnico Pesquero	Oscar Julio Rodríguez
- Inspector de Obra (todo el río)	Fernando Erazo
- Secretaria	Rosa Elvia Riascos
- Aseadora	Consuelo Riascos
- Vigilante	Ricardo Riascos
- Vigilante	Felipe Viveros
- Vigilante	Gerardo Ortega
- Vigilante	Hubert Cortés
- Vigilante	Melenciano Hurtado
- Motorista	Juan Góngora
- Motorista	Lorenzo Palma
- Motorista	Milton Riascos

6.4.2. **Zona 05 - Zaragoza**

- Jefe de Zona	Victor Mario Silva
- Asistencia Técnica Agrícola	Omar Garcés -Sec.Agric.
- Vigilante	
- Motorista	

6.4.3. **Zona 06 - Lopez de Micay**

- Promotor Social (Jefe de Zona) Carlos López
- Asistente Técnico Agrícola Benjamín L. Ramírez
- Asistente Técnico Minero Alberto Velásquez
- Vigilante
- Motorista Omar Caicedo

6.5. **Personal Río Saija**

6.5.1. **Zona 07 - Puerto Saija**

- Coordinadora Río Elsy Muñoz P.
- Subadministrador Río David Mejtar
- Promotora Social Adriana Espinosa
- Asistente Técnico Agrícola (Jefe de Zona) Nelly Pérez Tamayo
- Asistente Socio Empresarial Rafael Chagúendo
- Asistente Técnico Pesquero Pedro Pablo Berneth
- Ingeniero Civil (Todo el río) Antonio Rueda
- Inspector de Obra (Todo el río) Jaime Riascos
- Secretaria Rosa Elena Asprilla
- Aseadora María Apolonia Rua
- Vigilante Felipe Ramírez M.
- Vigilante Melenciano Hurtado
- Vigilante Lorenzo Montaña
- Motorista Eleodoro Mosquera
- Motorista Jorge Zamora
- Motorista Adriano Montaña

6.5.2. **Zona 08 - Boca de Patia**

- Asistente Técnico Agrícola (Jefe de Zona 08) Fredy Bonilla
- Ingeniero de Minas
- Motorista José Celacio Hurtado

6.5.3. **Zona 09 - San Bernardo**

- Asistente Técnico Agrícola Zona 08 - 09 Osnelín Caisamo P.
- Promotora Social (Zona 09 y 10) Aura González S.
- Asistente Técnico Minero Melfi Mendez M.
- Vigilante Bernabé Torres
- Motorista Licinio Banguera

6.5.4. **Zona 10 - Santa Rosa**

- Asistente Técnico Minero (Jefe de Zona)
- Vigilante José Decio Hurtado
- Motorista Eduardo Hurtado

6.6. **Equipo de Especialistas**

- Area de Comercialización Nelson Amorocho
- Asesor de Asociativismo Gustavo Cano
- Asesor en Comunicaciones Manuel Vicente Llanos C.
